Paquete de trabajo de cocina Unidad 4

K000

Para John y los oficios de cocina. Revisión C, 2 de noviembre de 2026. La Rev C redistribuye el tramo sur según el plano MASTER vigente de Magicplan (cambio de John del 2 de noviembre): lavavajillas 51–75, base de fregadero 75–105, eje del fregadero 90, relleno nuevo de aprox. 6 15/16. Use este paquete para recorrer el cuarto, conservar la distribución elegida, preparar materiales y resolver los puntos de espera antes de cada trabajo afectado. Base de cocina revisada el 30 de octubre de 2026. Enmienda de coordinación del tablero del 1 de noviembre de 2026 para revisión; vea K306. Siguen los puntos de espera.



Evidencia de sitio P02, 26 de octubre. Actualización S15: contrapiso instalado, muros abiertos, estructura incompleta.

Empiece aquí

Recorra los muros sur, este y oeste con K011–K014. Marque las estaciones de gabinetes de K002. Coordine la estructura y después electricidad, plomería y campana antes de cerrar los muros. El piso terminado, línea de gabinetes, plantilla del fregadero y placas de aparatos aún controlan el ajuste final.

Este es un borrador coordinado de trabajo. No autoriza cortes, compras, trabajos ocultos ni construcción. Las fuentes, cantidades y decisiones pendientes se conservan con el paquete editable.

Índice y uso de este paquete

K005

K000 Paquete de trabajo de cocina Unidad 4
K005 Índice y uso de este paquete
K010 Decisiones actuales y reglas de fuentes
K011 Recorrido del muro sur
K012 Recorrido del muro este
K013 Recorrido del muro oeste de estufa
K014 Recorrido de la alacena empotrada
K001 Fuente Magicplan y registro del cuarto
K002 Replanteo y tamaños exactos de bases
K101 Elevación sur y vista de diseño
K102 Elevación este y vista de diseño
K103 Elevación oeste y vista de diseño
K104 Estudio de almacenaje empotrado e interfaz
K105 Maqueta de volúmenes de gabinetes
K201 Programa de gabinetes y acabados
K202 Programa de aparatos y accesorios
K301 Estructura y preparación
K302 Instalación eléctrica e iluminación
K306 Tablero y requisitos previos de estructura
K303 Plomería y conexiones
K304 Campana y coordinación mecánica
K305 Muros piso gabinetes y acabados
K203 Cantidades de piso muros y techo
K204 Cantidades de cubierta y salpicadero
K401 Secuencia responsabilidades y liberación
K402 Lista de campo y recorrido final
K901 Fuentes habilidades y registro de revisión
K902 Índice de fuentes enlazadas

Cada página de oficio indica requisitos previos, materiales, verificaciones y punto de espera. Las casillas vacías representan trabajo por verificar; no indican finalización. Todas las medidas están en pulgadas salvo indicación. AFF significa sobre piso terminado; SF, sobre contrapiso.

Decisiones actuales y reglas de fuentes

K010

Conservar	Base actual
Gabinetes sur	36 esquina + 15 basura + 24 hueco lavavajillas + 30 fregadero = 105, luego relleno de aprox. 6 15/16 (105 a aprox. 112). Eje del fregadero 90 desde esquina SE. Magicplan 2 nov.
Gabinetes este	Esquina compartida 36 + cajonero propuesto 24 + espacio refrigerador 28 = 88. Sin envolvente ni gabinete encima. S02/S03
Gabinetes oeste	18 base + 30 estufa + 18 base = 66. Conservar distribución. S02/S03
Gabinetes altos y nicho	Altos opcionales. Conservar concepto de alacena empotrada; se permite reconstruir/reducir. Medidas condicionales en K104.
Acabados y sitio	Piso sin decidir. Essex Green es dirección previa; acabado alternativo sin elegir. Contrapiso instalado, muros abiertos, estructura incompleta. S02/S15

Lea el tipo de evidencia

Las medidas de campo reportadas tienen fecha y extremos identificados. Las medidas del modelo son etiquetas o cálculos, no nuevas mediciones. Las propuestas esperan selección o ajuste. Comprado, recibido, instalado y aceptado son estados separados. El tramo sur antiguo de 102 y basura de 12 se sustituyen por el modelo 105/15. El orden de la Rev B (fregadero 51–81, lavavajillas 81–105, eje 66) queda sustituido por la Rev C (lavavajillas 51–75, fregadero 75–105, eje 90).

Recorrido del muro sur

K011



P01 muestra la ventana conservada y la alacena empotrada existente. La foto documenta condición, no medidas.

[ ] Ubique la esquina sureste de muros terminados. Marque estaciones sur 0, 36, 51, 75, 105 y aprox. 112 (fin del relleno); eje de fregadero en 90.

[ ] Verifique tramo útil reportado de 115 hasta la moldura. No vuelva a descontarla. Registre superficies terminadas, eje, antepecho y molduras de ventana.

[ ] Ubique el fregadero comprado y su plantilla. Verifique juntos la base de 30 (75–105), grifo, triturador y rutas del lavavajillas. El fregadero queda bajo la ventana: VERIFICAR que la altura y el giro del grifo libren la hoja abatible y la moldura del antepecho (antepecho 45 15/16 AFF).

[ ] Mida el paso con el extremo de cubierta y puerta del lavavajillas abierta. El relleno (aprox. 6 15/16) se ajusta en sitio; quedan aprox. 3 hasta la moldura en 115.

Recorrido del muro este

K012



Instrucción para P02: cerrar abertura DERECHA de esta foto; conservar IZQUIERDA y ventana. No se afirma cierre terminado.

[ ] Confirme el cierre previsto antes de armar. Registre límites, soporte, servicios y acabados; la foto es de gran angular.

[ ] Desde esquina SE marque 36, 60 y 88 hacia norte. Verifique extremo real de moldura; 88.5–89 sigue siendo una estimación.

[ ] Compare placa física Haier con ficha dimensional. Verifique ambas puertas, cajones, moldura y acceso de traslado/servicio. Manténgalo independiente.

[ ] No añada gabinete superior, paneles envolventes ni línea de agua para hielo sin una nueva selección.

Recorrido del muro oeste de estufa

K013



P03 muestra ducto metálico y construcción abierta. La foto no establece destino ni aptitud del ducto.

[ ] Conserve 18–30–18. Relacione extremo sur del tramo con una jamba o muro fijo; falta registrar ubicación absoluta.

[ ] Verifique tramo reportado del rincón de 66 1/4. Un conjunto nominal de 66 deja sólo 1/4 antes de los ajustes.

[ ] Verifique combustible, remate trasero, superficie de cocción, placa de campana, techo y composición combustible antes de fijar el nicho.

[ ] Rastree todo el ducto. Se reportó conexión hacia abajo; no suponga descarga independiente ni aprobación de reutilización.

Recorrido de la alacena empotrada

K014



P04 revestimiento y juntas existentes; evaluar condición antes de especificar reparación.




P05 cavidad y servicios visibles. Medir profundidad útil después del revestimiento y protección previstos.

[ ] Conserve almacenaje empotrado. Inspeccione cavidad, servicios, soporte, interfaces exteriores/de aire y revestimiento; no deduzca riesgos ni estructura de estas fotos.

[ ] Use estudio condicional K104 después de conciliar esquina terminada y borde aproximado de 59.

Fuente Magicplan y registro del cuarto

K001

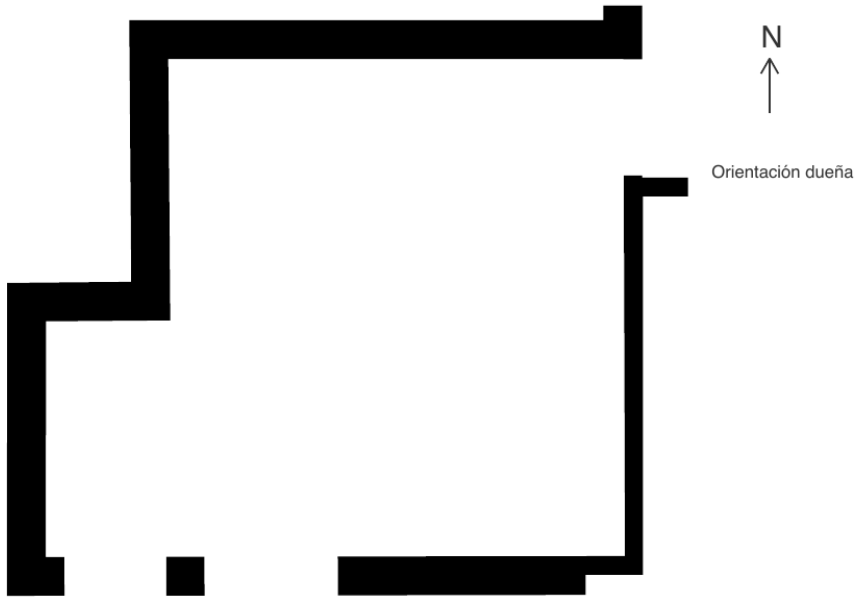


Trazo nativo de muros S01, recortado para lectura. Original y 688 elementos conservados aparte. Sólo escala gráfica.

Medida	Valor	Tipo de evidencia
Muro completo fregadero / profundidad	147 / 126	Etiquetas de plano John 14 oct.; S13/S14
Tramo rincón / retranqueo	66 1/4 / 31 1/2	Reportado por Ervin; adoptado en modelo
Opuesto / tramo restante	115 1/2 / 59 3/4	Derivados: 147–31.5 y 126–66.25
Tramo útil fregadero a moldura	115	Reporte John + Ervin; no muro completo

Unidades físicas SVG y registro en campo sin resolver. No mida del dibujo para obra. Profundidad bloqueada 126 y extensión gris 126 1/4 siguen discrepantes. Lecturas a lápiz del 13 oct. se conservan en S04; no sustituyen geometría posterior.

Replanteo y tamaños exactos de bases

K002

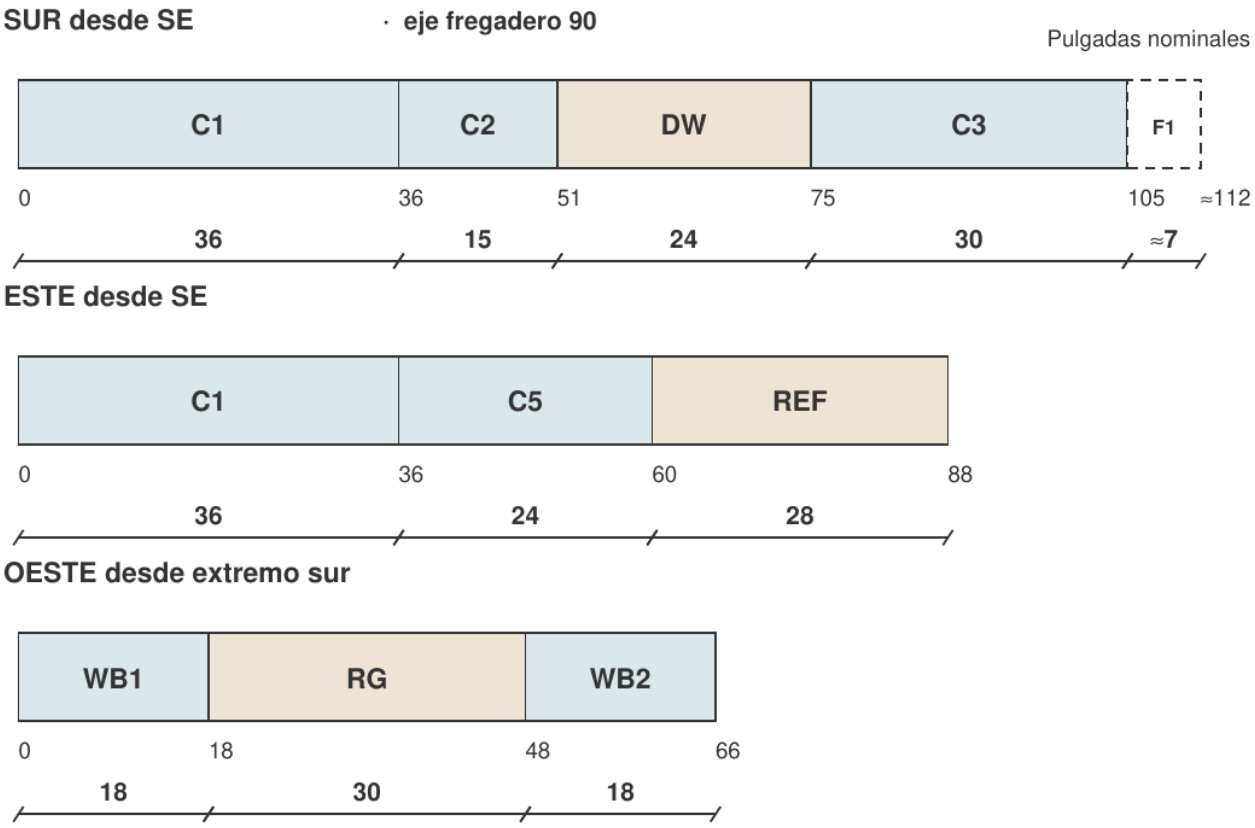


Tres diagramas de estaciones; pulgadas nominales, independientes del plano sin calibrar.

ID	Cant.	Tamaño y ubicación
C1	1	Esquina 36 × 36; SUR 0–36 y ESTE 0–36; contar una vez
C2 / C3	1 / 1	Basura 15 ancho en SUR 36–51; fregadero 30 en 75–105
C5	1	Cajonero 24 ancho en ESTE 36–60; propuesta
WB1 / WB2	1 / 1	18 ancho cada una; OESTE 0–18 y 48–66
DW / RG / REF	Huecos	SUR 51–75 =24; OESTE 18–48 =30; ESTE 60–88 =28

Seis gabinetes base en total. Anchos fijados para esta distribución de trabajo; altura/profundidad, herrajes de esquina, rellenos, extremos y profundidad de cubierta sin elegir. Coincidir en ancho nominal no demuestra compatibilidad.

Elevación sur y vista de diseño

K101

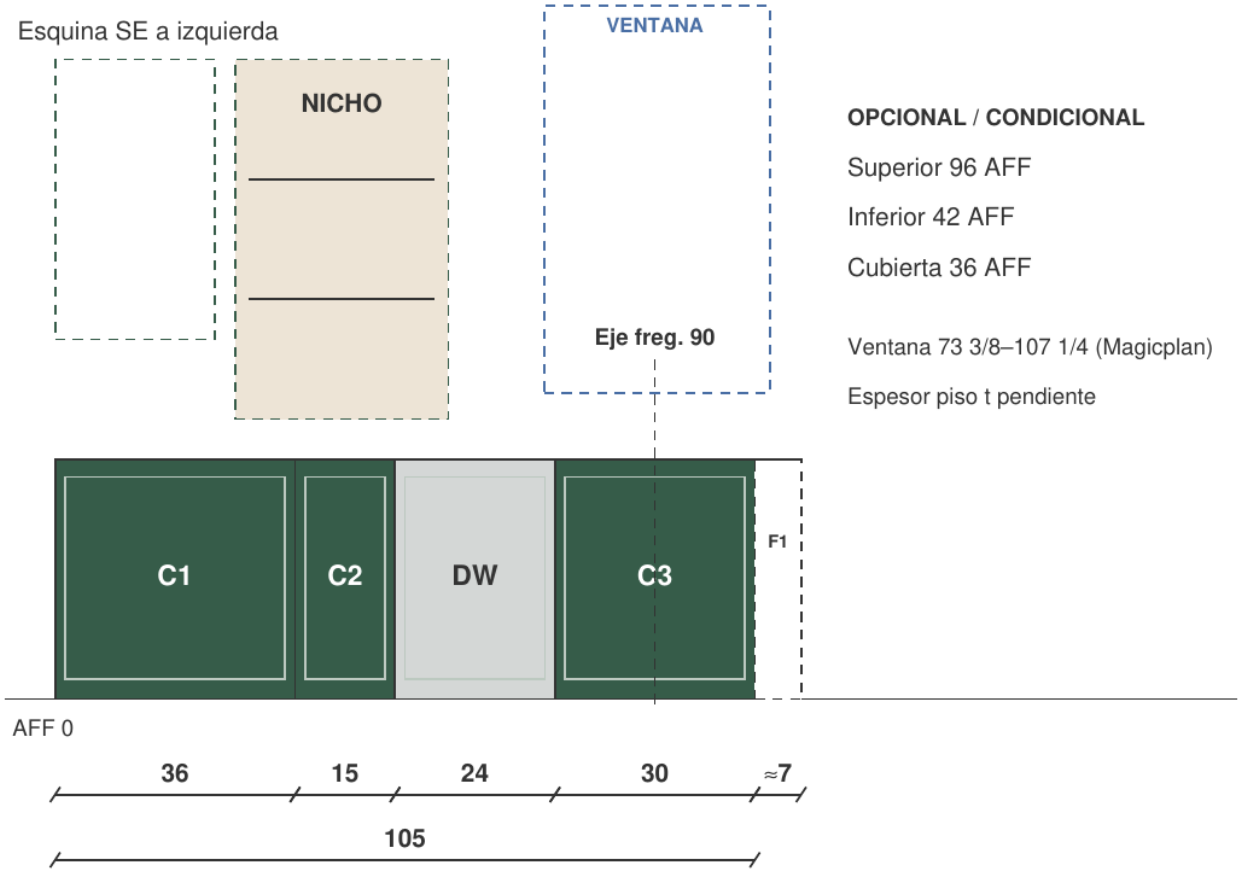

Mirando sur, esquina SE a izquierda. Anchos nominales exactos; alturas propuestas. Visualización, no levantamiento.


Cadena sur: 0–36 C1, 36–51 C2, 51–75 DW, 75–105 C3, 105 a aprox. 112 relleno F1. Eje fregadero 90. Extremo reportado de moldura 115; quedan aprox. 3 de holgura. Ventana según Magicplan: 73 3/8 a 107 1/4 desde SE, eje 90 5/16; el fregadero queda aprox. centrado bajo ella.

Cubierta 36 AFF es objetivo. Hueco libre condicional 30 ancho × 54 alto, inferior 42 y superior 96 AFF. Altos opcionales de 42 se alinean 54–96 AFF. El dibujo no especifica altura de cajas, zócalo ni hueco estructural. S02/S03.

[ ] Resuelva espesor de piso t antes de marcas SF: marca SF = objetivo AFF + t. Verifique fregadero/ventana y nicho/cubierta en sitio.

Elevación este y vista de diseño

K102

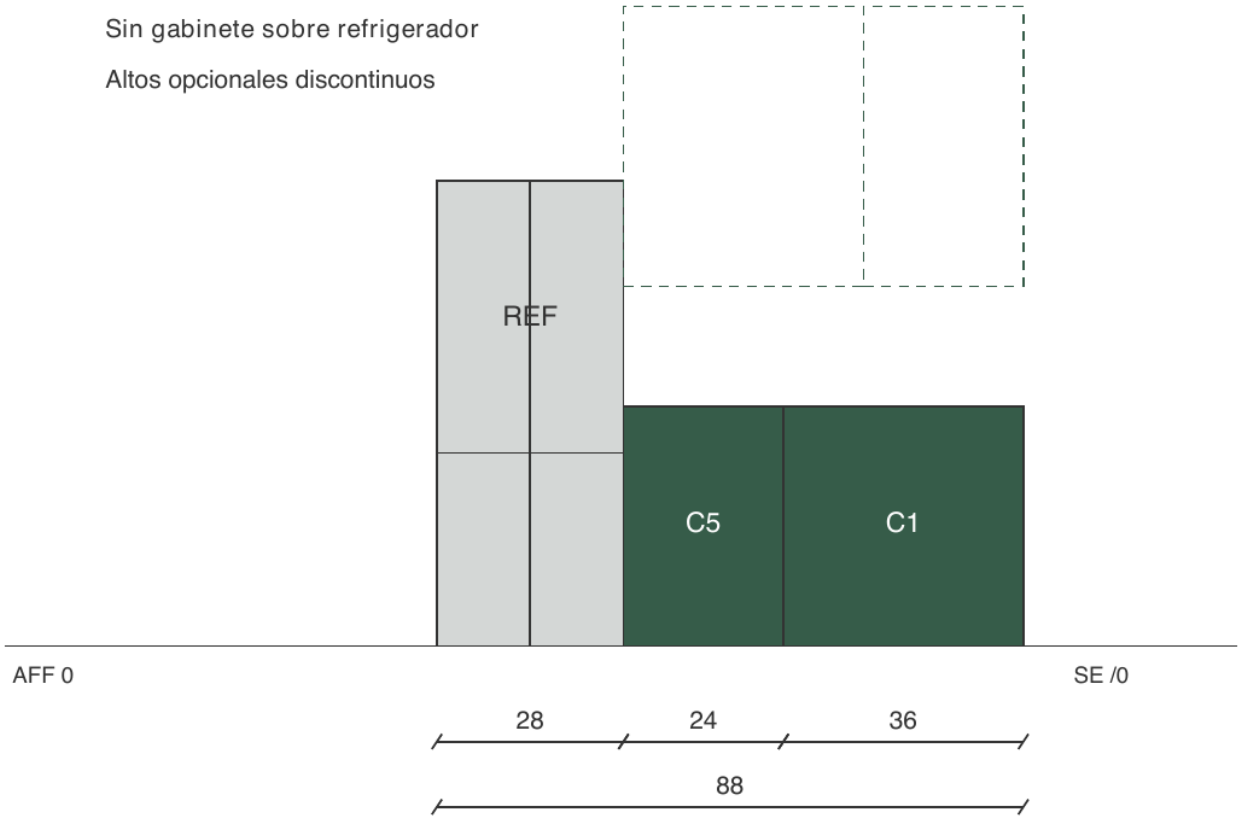

Mirando este, esquina SE a derecha. Altos opcionales con contorno discontinuo. Refrigerador independiente.


Desde SE hacia norte: esquina 0–36; cajonero 36–60; espacio nominal refrigerador 60–88. Retorno estimado 88.5–89 deja 0.5–1 antes de ajustes. No constituye aprobación de ajuste.

Haier S08: cuerpo 27 9/16 ancho × 26 9/16 fondo × 69 7/8 alto; separación trasera 2; laterales/superior 0. Envolvente con puertas a 90°: 29 5/8 ancho y 38 fondo desde parte trasera. Verifique revisión física y paso circundante.

Otros registros muestran medidas de cuerpo diferentes. Mantener conflicto de revisión abierto. Alto esquinero opcional con lados 24; alto recto opcional 36 ancho × 42 alto × 12 fondo. Ningún gabinete ni envolvente sobre refrigerador.

Elevación oeste y vista de diseño

K103

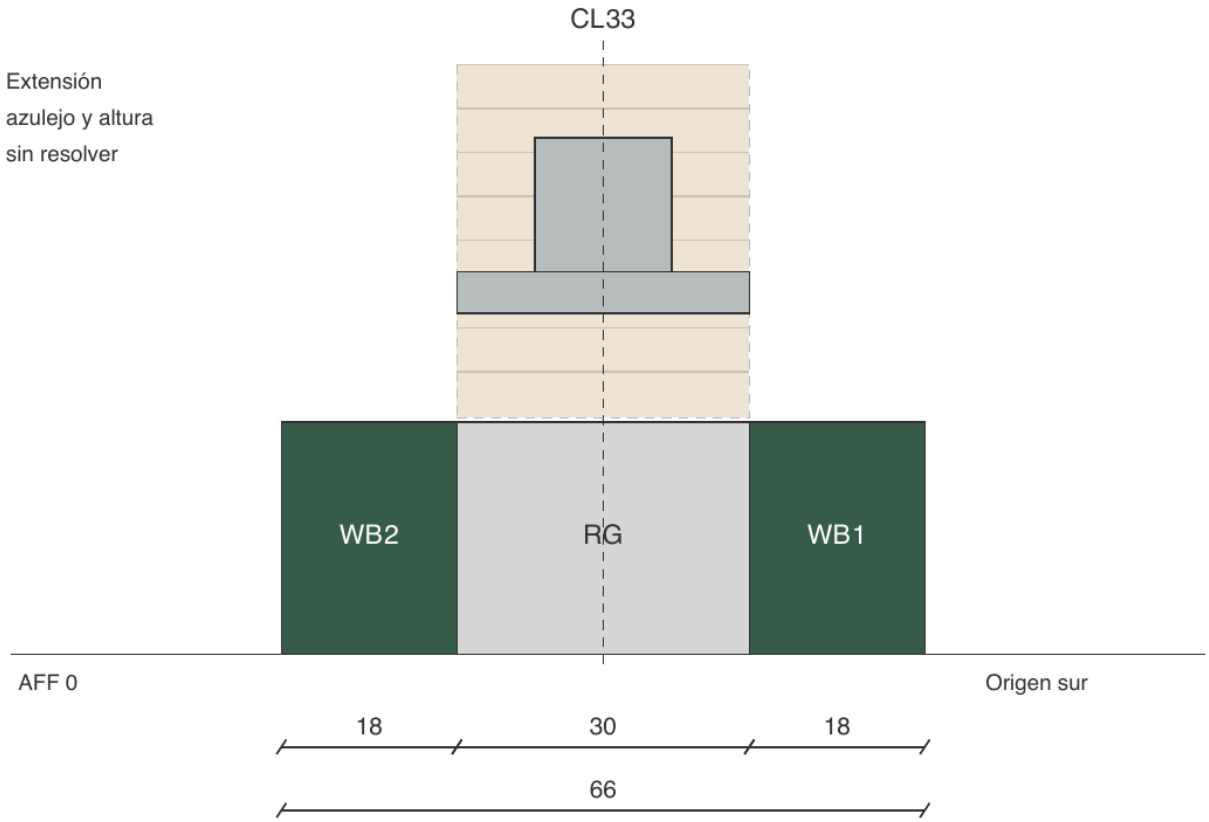

Mirando oeste, extremo sur a derecha. Eje estufa/campana 33 desde ese origen. Azulejo es visualización sin seleccionar.


Conserve 18–30–18. No añada nicho antiguo 42 ni pilastras 4 dentro del tramo 66 sin nuevo control dimensional. Azulejo de estufa a techo sigue como dirección; ancho, altura, retornos y remates pendientes.

Viking S10 recomienda campana 30–36 sobre cubierta; Zephyr S11 permite 28–36 sobre superficie de estufa. Si coinciden los orígenes, banda común 30–36. Medir superficie de cocción, cubierta y campana antes de elegir altura. No se libera altura AFF numérica.

[ ] Resuelva construcción combustible lateral/trasera, remate de estufa y soporte de campana antes de estructura o azulejo. El azulejo solo no demuestra un conjunto incombustible.

Estudio de almacenaje empotrado e interfaz

K104

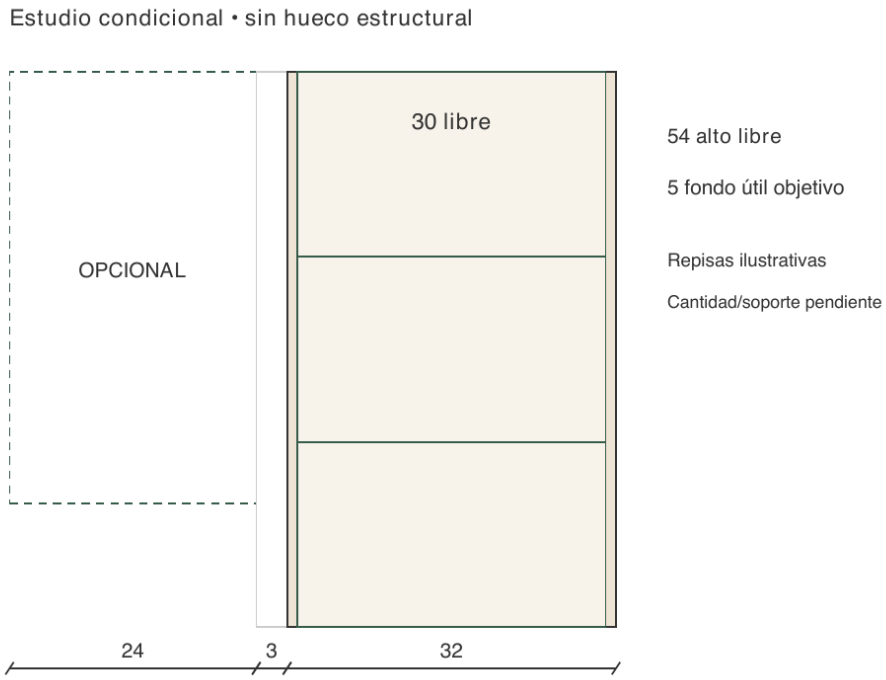

Estudio condicional: gabinete alto opcional de 24 de ancho + separación de 3 + zona de conjunto de 32 =59. No es plano de corte estructural.




P06 cinta cerca de 59 en un borde; origen completo no visible. Conservar estado aproximado.

Objetivo libre 30 ancho × 54 alto × 5 fondo útil. Zona 32 incluye 2 totales provisionales de acabados laterales. Cantidad, material, espesor, soporte de repisas y fondo útil pendientes. Superior 96 e inferior 42 AFF son propuestas. Resolver alto opcional y borde esquina/ventana antes de fabricar.

Maqueta de volúmenes de gabinetes

K105

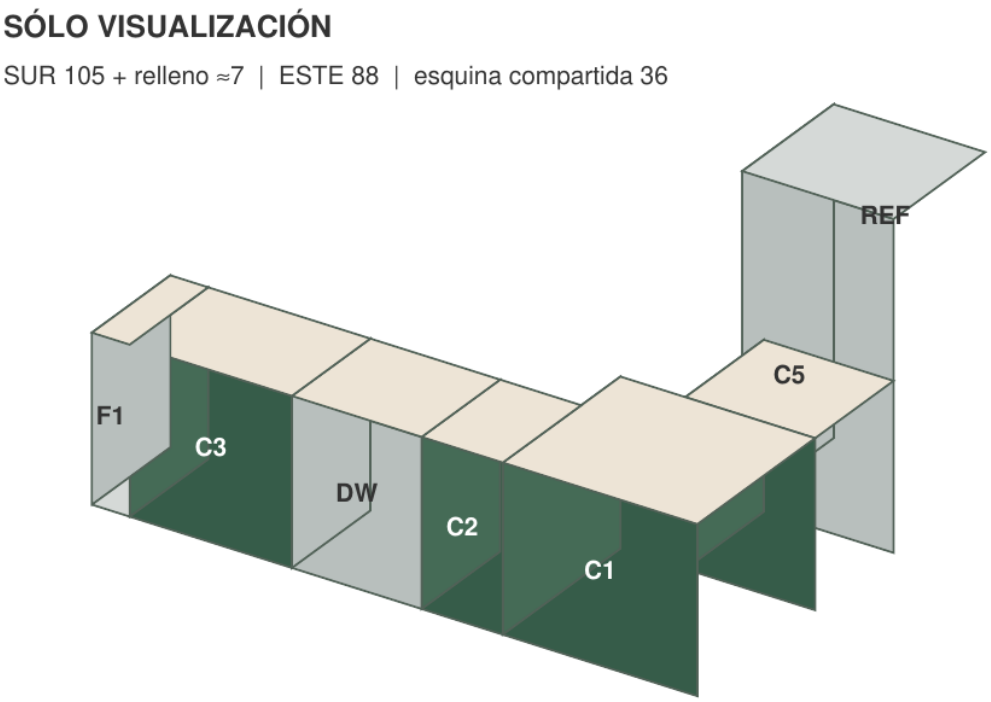

Visualización axonométrica del tramo L nominal actual. Frentes y colores ilustrativos; no implica levantamiento ni acabado de piso.

La esquina compartida 36 aparece una vez. Sur continúa 15 basura, 24 hueco DW, 30 fregadero y aprox. 7 de relleno. Este continúa 24 cajonero y 28 espacio de refrigerador. La maqueta usa fondo 24 y altura cubierta 36 sólo como supuestos gráficos; dimensiones reales y fondo de cubierta pendientes.

Muros, aberturas y pasos no están ubicados en esta visualización porque falta registro de campo. Use K001 para geometría fuente sin cambios y K002 para estaciones dimensionadas. No se añade gabinete sobre refrigerador. Altos opcionales y tramo oeste se muestran en sus elevaciones.

Programa de gabinetes y acabados

K201

Material	Base de cantidad	Selección y ajuste necesarios
Cajas de bases	6 requeridas	C1, C2, C3, C5, WB1, WB2; anchos K002. Producto, altura/fondo, superposición, bisagras y soporte pendientes.
Gabinetes altos	0 requeridos; 2 opcionales	Esquina 24 + recto 36; estudio 42 alto. Elegir u omitir antes de refuerzos/luces.
Rellenos y paneles	Desconocida	Relleno F1 aprox. 6 15/16 en SUR 105–112 (Magicplan); ajustes, extremos, soporte/paneles DW y zócalos según línea real.
Cubierta	Fórmula K204; final desconocida	Material/color/espesor/canto, soporte, juntas y plantilla de fregadero pendientes.
Piso y transiciones	Área modelo K203	Sin decidir; inspeccionar existencias y elegir conjunto/espesor antes de alturas.
Azulejo estufa y salpicadero	Extensiones desconocidas	Azulejo, sustrato, mortero, boquilla, juntas y remates pendientes.
Pintura y molduras	Áreas desconocidas	Essex Green dirección previa; demás pinturas, brillo, preparación y perfiles pendientes.
Nicho y refuerzos	Desconocida	Inspeccionar cavidad; elegir revestimiento/repisas/soporte y servicios antes de cuantificar.

Gabinetes recuperados siguen en estudio. Verifique alturas/fondos compatibles e interiores útiles; pintura no iguala perfiles diferentes. Inspeccione existencias antes de calcular compras. No se inventan costos ni cantidades netas.

Programa de aparatos y accesorios

K202

Elemento y estado	Base actual	Evidencia siguiente
Fregadero comprado según dueña	Modelo/montaje desconocidos; base 30. S13	Unidad, recibo, plantilla, base mínima, desagüe/grifo y soportes.
Refrigerador Haier comprado	QJS15HYRFS; S08/S09. Sin kit de agua supuesto.	Placa/revisión, recepción/ubicación, apertura y ventilación.
Estufa comprada según dueña	Viking VGCC5304BSS adoptada para cálculo; S10.	Modelo físico, combustible, remate, antivuelco, distancias y servicios.
Campana comprada según dueña	Zephyr ZSA-E30AS adoptada; S11.	Placa, montaje/soporte, ducto/ruta/terminación y energía.
Bosch DW seleccionado para cálculo	SHV9PT53UC; S05. Compra no probada. Hueco 34 1/8 alto × 24 ancho × 24 fondo S06.	E-Nr físico completo/revisión; hueco terminado, panel/tirador y conflicto eléctrico.
Triturador sólo propuesto	Badger5 con cable SKU 79883A-ISE; no comprado.	Confirmar montaje, espacio, cable/interruptor y plomería.
Grifo e iluminación	Modelos y adquisición sin verificar	Ajuste grifo bajo ventana; 3 luces de tarea (T1 18, T2 54, T3 90 en eje fregadero) + 1 principal + driver UC según KE Rev E; compatibilidad.

Compra no demuestra entrega, instalación ni aceptación. Esos estados siguen sin verificar aquí. Conservar e inspeccionar elementos propios antes de proponer reemplazos.

Estructura y preparación

K301

Alcance y requisitos previos

John coordina esta fase con los oficios correspondientes. Estado inicial: contrapiso instalado, muros abiertos, estructura incompleta. Primero recorrer, confirmar la posición de las superficies terminadas y las marcas de replanteo de los gabinetes; después coordinar soportes y servicios.

Materiales por identificar antes del trabajo

Elementos estructurales/reparación, refuerzos para gabinetes/campana, revestimientos/soportes del nicho, cierre de abertura, fijaciones y conjuntos de muro/techo. Tamaños y cantidades dependen de soporte/servicios reales; no se deducen de fotos.

[ ] Verificar condición y origen del contrapiso; instalado no significa nivelación o aptitud aceptada. Establecer espesor futuro.

[ ] Confirmar cierre DERECHO en P02 y conservar abertura IZQUIERDA/ventana. Resolver estructura y servicios antes de alterar. Para estructura del tablero D04 se requieren caja y remate compatibles en sitio; vea K306.

[ ] Ubicar soporte de bases, altos opcionales, campana, nicho y luminarias. Dejar acceso y coordinar ductos/tuberías/cables.

[ ] Registrar condiciones ocultas, refuerzos y penetraciones con fotos fechadas y medidas antes de cerrar.

Terminado cuando y punto de espera

Interfaces resueltas, soporte confirmado por oficio responsable, rutas compatibles con distribución aceptada y evidencia de inspección/pruebas requerida registrada. Detener cierre donde falten servicios, soporte o inspección. Pueden continuar búsqueda de materiales y muestras no afectadas.

Instalación eléctrica e iluminación

K302

Alcance y requisitos previos

Electricista coordina dispositivos tras marcar estructura, piso, gabinetes y aparatos. Tisa confirma Romex para circuitos derivados de cocina; tipo listado, calibre, conductores, ruta e instalación requieren revisión eléctrica. Cantidades sin medir. Son propuestas de diseño de la dueña, no aprobación de circuitos. La dueña eligió Eaton de 20 espacios completos; aceptación técnica de tablero/alimentador pendiente. Vea K306 y S02, S05–S11.

Propuesta de circuito	Dispositivos o estación
SA-A 20 A / SA-B 20 A / SA-C 20 A	ESTE E1/E2 en 12/48; SUR S1/S2 en 36/93; OESTE W1/W2 en 9/57. Alturas pendientes.
REF / RG / DW / GD / HD	Cinco alimentaciones separadas; HD fijo propuesto. DW/GD con neutros separados, sin circuito compartido propuesto.
LT un circuito de iluminación	3 luces de tarea sobre fregadero (T1 18, T2 54, T3 90 desde SE, 15 desde muro sur), 1 principal, driver UC. Controles en entrada; remoto inalámbrico en fregadero controla grupo de tarea; UC control separado. Según KE Rev E.

[ ] Resolver conflicto Bosch: S07 PDF p 8 requiere 15 A dedicado; propuesta antigua 20 A. Verificar E-Nr/manual y diseño antes de liberar.

[ ] Prever cajas de techo para la luz principal y tres luces de tarea (18, 54, 90) y driver UC accesible. Ruta LT según KE Rev E: tablero a ático a controles; luces de tarea en paralelo eléctrico. Verificar ruta/soportes.

Materiales y terminado cuando

Elegir protecciones, conductores/canalizaciones, cajas, receptáculos, interruptor de motor, controles y driver según cargas/detalles verificados. Nueve circuitos propuestos de cocina más interfaz HVAC; amperaje de interruptor no es carga. No cerrar sin verificaciones/fotos. Base de alimentador: 100 A cobre en conducto; antigua 80 A/#4 sustituida para cantidades. Aceptación de instalación y coordinación Trane/Lennox anterior siguen con responsables. Vea K306/S24.

Tablero y requisitos previos de estructura

K306

Enmienda del 1 de noviembre de 2026. REVISIÓN; CORTE EN ESPERA. Actualiza dependencias de cocina respecto al tablero. Responsables eléctrico e interior conservan diseño y liberación D04. S17–S24.

Selección definida y revisión técnica

La dueña eligió Eaton BRP20L125G, 20 espacios completos, 125 A MLO, X2. Cubierta compatible BRPX2A20L1F y barra de tierra incluidas según ficha; verificar conjunto en sitio. Máximo 40 circuitos no significa 40 espacios. BRP20L125G125AMLO es texto comercial descriptivo sin verificar, no otro catálogo. S18/S24.

Expectativas anteriores >=40/42 espacios sustituidas. Revisión eléctrica: 18 propuestas actuales 120V unipolares dan preliminarmente 18 espacios ocupados /2 sin asignar, sin tándems. Alimentador aguas arriba no ocupa espacio derivado; equipos bipolares futuros pueden consumir reserva. Base de dueña: 100 A cobre en conducto; antigua 80 A/#4 sustituida para cantidades. Cobre #3 cabe en terminales publicados #6–2/0; carga/protección/conexión e instalación finales en espera. S24.

Referencia D04 y límites dimensionales

Usar relleno de entrada oeste del comedor R2 D04, hacia comedor. W: borde exterior de moldura de ventana más a la derecha hasta esquina interior derecha del muro oeste; puerta con sobreluz del muro norte perpendicular queda fuera. Falta W medida. Propuestas x = W/4 + 1 pulg y 65 pulg AFF sin liberar; confirmar referencia de caja/cubierta y espesor de piso. No sustituir E11 hacia sala aprox. 12 pulg. S19.

Metadatos Eaton: 21 longitud/profundidad, 14.31 ancho, 3.88 altura. Croquis X2 reportado aparte: 21.10 alto × 14.30 ancho × 3.80 fondo. Ninguno define instalación ni cortes. Cubierta compatible BRPX2A20L1F: 15.3 ancho × 22 alto × 1 fondo publicados; verificar remate recibido y ajuste físico. Distancias y hueco de obra sin verificar. Vea S21 y plano D04 de revisión actual S22.

Requisitos y liberación del trabajo

[ ] John debe tener caja real Y remate compatible en sitio antes de estructura D04. Obtener referencias medidas, detalle estructural y liberación técnica responsable antes de cortar o cerrar trabajo afectado.


[ ] Responsable eléctrico aporta cantidades de cable con rutas medidas, conductores/calibres, método permitido, desperdicio y existencias. Cantidades de cocina afectadas siguen en espera. Compra del tablero pausada hasta lunes 2 de noviembre de 2026. Requiere aprobación actual de cotización/pago; sin compra automática. S23.

Plomería y conexiones

K303

Alcance y requisitos previos

Plomero parte del fregadero comprado, plantilla, base 30 en 75–105 y eje 90 desde esquina SE. El brazo de desagüe/sifón y la ventilación se mueven aprox. 24 al oeste desde el eje antiguo 66 y quedan justo bajo la ventana (antepecho 45 15/16 AFF, cabezal aprox. 104): la ventilación no puede subir recta por el hueco ni el cabezal de la ventana y debe desviarse — revisión de plomería. El lavavajillas (51–75) queda a la IZQUIERDA del fregadero; su manguera de desagüe y alimentación entran a la base del fregadero por la izquierda. Confirmar espesor de piso, cara inferior de cubierta, triturador e instrucciones reales DW. Centros de tuberías y alturas sin establecer.

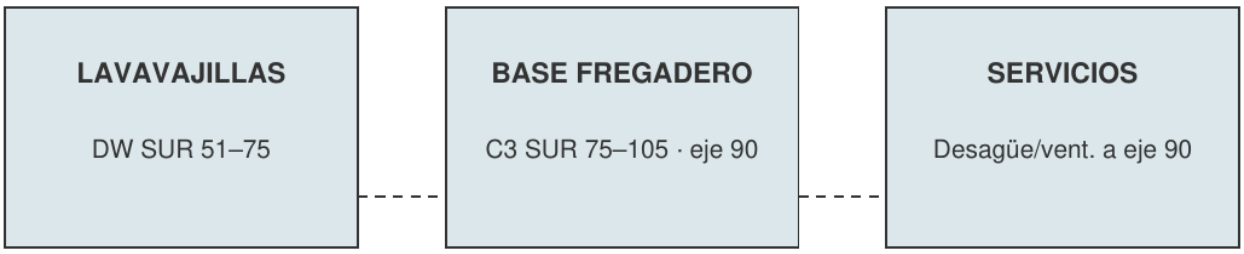

Conexiones adyacentes accesibles • sólo diagrama

Fregadero bajo ventana: ventilación debe desviarse — revisión plomería

Relación funcional solamente. No se especifican rutas, pendientes, diámetros ni alturas de conexiones.

Materiales por identificar

Soportes/kit del fregadero, grifo y conectores, válvulas de aislamiento accesibles, desagüe/colador/sifón, manguera y conexión DW con protección requerida, brida de triturador y accesorios compatibles. Inventariar piezas incluidas; cantidades según rutas y productos.

[ ] Mantener conexión eléctrica DW accesible en la base de fregadero adyacente según S07 (KE Rev E: caja doble DW + GD a 79 desde SE, 14 AFF, dos circuitos); coordinar servicios húmedos y espacio de triturador/fregadero.

[ ] Registrar rutas de agua caliente/fría, desagüe/ventilación, aislamiento y DW; confirmar protección de drenaje. No hay línea de agua de refrigerador seleccionada.

Terminado cuando y punto de espera

Oficio verifica distribución, acceso y pruebas/inspección requeridas con evidencia fechada. Detener cierre y corte de cubierta hasta resolver ajustes/plomería. Método/duración de prueba según producto y requisitos aplicables; este paquete no los inventa.

Campana y coordinación mecánica

K304

Alcance y requisitos previos

Instalador de campana coordina con electricista e instalador de estufa. Comparar placas Viking/Zephyr y remate con S10/S11; verificar orígenes de cocción/cubierta, techo, estructura y muro. Conservar hueco 30 y eje 33 del tramo oeste.

Requisito de fuente	Consecuencia actual
Zephyr S11 PDF p 3	28–36 sobre la superficie de la estufa; altura total del conjunto de campana 30–45, incluido el cuerpo y el cubretubo telescópico. Confirmar compatibilidad con el techo antes de montar.
Viking S10 pp 10–11	Campana recomendada 30–36 sobre cubierta; remate lateral 3/8 sobre cubierta; mínimo 6 a lados combustibles sobre cubierta 36. Revisar conjunto real.
Condiciones Viking traseras y superiores	Remate isla y respaldo/repisa tienen condiciones diferentes. Fondo máximo de altos 13 y 18 sobre cubierta en zona indicada. Azulejo no exime distancias.
Base ducto Zephyr	Mínimo 6 redondo o 3 1/4 × 10 metal rígido; límite 100 pies equivalentes con descuentos de accesorios/tapa. Falta ruta medida.

Lista y materiales

[ ] Rastrear origen a terminación exterior, medir tamaños/longitudes/codos, identificar conexión inferior y establecer uso independiente previsto.

[ ] Especificar ducto, transiciones, compuerta/tapa, sellado/soporte, montaje y antivuelco/conexiones después de conciliar ruta/manuales.

Terminado cuando y punto de espera

Detener reutilización, altura de campana y cierre hasta resolver ruta completa, distancias, soporte y verificaciones. Este paquete no aprueba escape compartido ni instalación de gas/eléctrica.

Muros piso gabinetes y acabados

K305

Alcance y requisitos previos

Después de estructura y verificaciones de instalaciones, oficios de acabado/gabinetes coordinan planos de muro, espesor de piso e instrucciones de gabinetes. Secuencia piso/gabinetes depende del conjunto elegido; no suponga que piso flotante puede quedar fijado bajo bases.

[ ] Cerrar sólo áreas liberadas, conservar acceso y completar preparación/acabados compatibles según producto.

[ ] Confirmar material, existencias, espesor, sustrato y transiciones. Documentar secuencia piso/gabinetes y extracción de aparatos.

[ ] Presentar seis bases en estaciones K002. Verificar operación esquina, plantilla, interior de extraíble, paneles/rellenos y hueco DW antes de fijar.

[ ] Plantillar cubierta tras aceptar bases y datos físicos de fregadero. Resolver soporte, juntas, corte, vuelos y canto con fabricante.

[ ] Todo trabajo de azulejo de cocina seleccionado requiere materiales correctos en sitio. John establece acabado e inicia/aprueba trazado real en seco, incluidas interfaces de cubierta, ventana, campana, tomas y transiciones. Confirmar sustrato, mortero/boquilla, juntas y bordes. CONTINUAR sólo área acotada liberada bajo supervisión de John; máximo 1 ayudante si después se asigna. PARAR por cambio de material/ajuste o falta de aprobación inicial de John.

[ ] Instalar accesorios, herrajes y molduras cuando superficies estén listas. Proteger según curado/manejo del material.

Materiales y terminado cuando

Usar K201 y K203–K204 para materiales medidos; productos/cantidades siguen pendientes donde falten datos. Fase termina al verificar superficies, operación, cubierta, acceso y función; cerrar pendientes fechados.

Cantidades de piso muros y techo

K203

Superficie	Cantidad actual	Base y limitación
Piso cocina	114.08 pies² modelo	Etiqueta 189 S01 / captura P07. Cuarto completo del modelo; no piso expuesto neto ni área nueva de campo.
Margen de planificación	10%: 125.49 pies² 15%: 131.19 pies²	Escenarios 114.08 × 1.10/1.15; ningún margen seleccionado. Depende de cortes reales.
Existencias reportadas históricas	8 × 1.440 m² =124.00 pies²	Reporte S02; 8.70% sobre modelo. Disponibilidad, lote, condición y elección sin verificar. No se confirmó novena caja.
Acabados muros/techo	Desconocida	Faltan alturas, segmentos, aberturas y retornos. No deducir rectángulo de dimensiones envolventes.

Fórmulas editables de cantidades

Área neta muro = [suma de cada longitud × altura –aberturas medidas + retornos medidos] /144, medidas en pulgadas. Techo requiere forma y pendientes reales. 114.08 es sólo posible proyección horizontal del modelo, no cuantificación verificada.

Área previa 116 pies² S13 se conserva como base fechada distinta; no se mezcla con 114.08. Longitud moldura =segmentos expuestos menos puertas/exclusiones más retornos. Pintura requiere rendimiento/capas y condición; no se asignan galones.

[ ] Registrar medidas, rendimiento, tamaño de caja, margen de cortes y stock útil antes de compra neta. Desconocido no es cero.

Cantidades de cubierta y salpicadero

K204

Componente	Fórmula o escenario	Datos faltantes
Partes rectas de cubierta	SUR 69 Ds + ESTE 24 De + OESTE 36 Dw, dividido 144	Fondos Ds, De, Dw desconocidos. Esquina compartida excluida de estas partes.
Ilustración sólo con fondo 24	(69 + 24 + 36) × 24/144 =21.50 pies²	Excluye esquina, vuelos, cortes y juntas. No es pedido/cantidad final.
Superficie bruta fabricada	[69Ds + 24De + 36Dw + Aesquina + Avuelos]/144	Forma de esquina, vuelos y juntas/soporte. Corte fregadero aparte; no asumir ahorro material.
Franja salpicadero sur escenario	105 × 18/144 =13.125 pies²	18 deriva de alto 54 menos cubierta 36; descontar ventana/nicho y sumar retornos reales.
Franja salpicadero este escenario	60 × 18/144 =7.50 pies²	Misma altura condicional; extensión/remate real sin resolver.
Azulejo oeste estufa a techo	Wnicho × (Htecho−Hcubierta)/144 + retornos	Faltan extensiones y descuentos campana/remates/aberturas. No reutilizar ancho antiguo 42.

Áreas de escenarios son verificaciones separadas, no suma para pedido. Nicho libre 30 × 54 =11.25 pies² es sólo abertura; revestimiento, repisas y retornos requieren medidas aparte. Cantidades finales desconocidas quedan vacías/null en datos editables.

Secuencia responsabilidades y liberación

K401

Fase	Responsable y trabajo	Terminado cuando
1 Recorrer y conciliar	Productor + John + oficios: orígenes, elementos propios, acabados y distribución.	Medidas con extremos; pendientes de producto/selección asignados.
2 Coordinar estructura	John + oficios: soporte, cierre, nicho, campana y rutas.	Soporte/rutas verificados; trabajo afectado liberado. Caja y remate D04 en sitio antes de estructura; rigen esperas K306.
3 Instalar y revisar	Electricidad, plomería, mecánica: detalles aprobados y registro oculto.	Pruebas/inspecciones y fotos requeridas antes de cierre.
4 Cerrar y preparar	Acabados: muros/techo; preparar piso y orden piso/gabinetes acordado.	Conjuntos listos según producto; espesor t fijado.
5 Colocar y plantillar	Instalador + fabricante: presentar, fijar, plantillar fregadero real.	Ajuste, soporte, huecos, acceso y juntas aceptados.
6 Acabar y conectar	Azulejo/acabados + instaladores de aparatos/plomería/electricidad.	Acabados/conexiones compatibles; función comprobada.
7 Revisar y entregar	John + dueña + productor: revisar, registrar excepciones/manuales.	Pendientes cerrados o conservados explícitamente; sin aceptación implícita.

Duraciones, reservas de cuadrilla y plazos sin verificar. No importar tiempos/costos de Unidad 2. Dueña conserva aprobación de gastos. Productor mantiene paquete; no se crea registro duplicado de proyecto, finanzas o Todoist.

Lista de campo y recorrido final

K402

Resolver antes de fabricación o instalaciones afectadas

[ ] Registrar esquina/moldura/ventana terminadas y origen oeste; medir paso con puertas/aparatos abiertos.

[ ] Elegir piso y espesor t; confirmar línea, cajas, rellenos/paneles y fondo de cubierta.

[ ] Localizar fregadero y placas; comparar plantillas/manuales; revisión eléctrica responsable resuelve 15 A/20 A Bosch.

[ ] Resolver cavidad/servicios, remate estufa/campana y ducto completo; sin suponer escape compartido.

[ ] Confirmar permisos/inspecciones requeridos con oficio responsable y líder antes del trabajo afectado.

Recorrido final después del trabajo real

[ ] Abrir gabinetes, extraíbles, aparatos y puertas; confirmar acceso/extracción y bordes protegidos.

[ ] Verificar plomería, aparatos, controles, triturador y campana según métodos requeridos; registrar resultados.

[ ] Inspeccionar transiciones, bordes/juntas, sellos cubierta/fregadero, repisas, pintura y molduras. Registrar pendientes con foto, responsable y fecha.

[ ] Guardar manuales, placas, fotos ocultas, evidencia de inspección/pruebas y garantías en carpeta compartida.

Registro: Fecha _____ Oficio/persona _____ ID _____ Observación _____ Evidencia/foto _____ Abierto/cerrado _____. Casilla marcada requiere evidencia; no autoriza gastos ni obra.

Fuentes habilidades y registro de revisión

K901

Revisión C, 2 de noviembre de 2026: tramo sur redistribuido según el plano MASTER vigente de Magicplan abb 2d2c6 tras el cambio de John. Hueco de lavavajillas 51–75 (aparato Magicplan 23 3/4), base de fregadero 75–105, eje del fregadero 90, relleno nuevo F1 de aprox. 6 15/16 en 105–112 (Base Filler Magicplan 0.17621 m). Esquina y basura, tramos este y oeste, muros, ventana, nicho y puertas sin cambios. Siguen: reubicación de desagüe/ventilación, holgura grifo/ventana y corte de cubierta. Eléctrico según KE Rev E. Todos los puntos de espera sin cambios.

Revisión B conserva fuentes y dimensiones de trabajo. A queda archivada. Su colocación de gabinetes en SVG usó conversión no verificada a pulgadas; se retira esa colocación. B separa muro nativo sin cambios de diagramas dimensionados. No se editó modelo nativo Magicplan.

Conservación de fuentes demostrada

Se leyeron y usaron localmente instrucciones Magicplan 0.2.1 y utilidad geométrica 0.1.0. Pasaron 19 pruebas. Ejecución con proyecto conservó 688 elementos y verificó 159 vértices con residuo máximo 0 píxeles SVG. Verifica conservación, no exactitud de campo. Escala física y registro siguen null/sin verificar.

No se expuso conector Magicplan ni motor CAD. Archivos de instrucciones no crean esas capacidades. SVG no exporta objectID nativos; se registran índices de elementos/vértices sin inventar identificadores. Sin instalaciones ni cuentas nuevas. Rutas, hashes, versiones y comandos están en skills/ADOPTION-RECEIPT.json y qa/.

Guía de fuentes

S01 exportación; S02 decisiones secuenciales; S03 estudio actual; S04 registro de campo anterior; S05 confirmación Bosch; S06–S11 fabricantes; S12 revisión refrigerador; S13 maestro fechado; S14 auditoría modelo; S15 estado actual; S16 precedente estructural Unidad 2. P01–P06 son fotos; P07 captura Magicplan.

Índice y JSON/CSV editables conservan procedencia y valores pendientes. Unidad 2 aportó encabezados, organización y criterios de finalización; no se transfirieron alcance, cantidades, costos ni tiempos. Base de cocina revisada el 30 de octubre de 2026. Enmienda de coordinación del tablero del 1 de noviembre de 2026 para revisión; vea K306. Siguen los puntos de espera.

Índice de fuentes enlazadas

K902

S01 S01-floor-plan-original.svg

S02 S02-Owner-Inputs-2026-10-26.md

S03 S03-Current-Model-Dimensions.md

S04 S04-source-accepted-measurements-2026-10-13.md

S05 S05-Owner-Selection-Confirmation-2026-10-27.md

S06 S06-Bosch-SHV9PT53UC-specsheet.pdf

S07 S07-Bosch-SHV9PT53UC-installation-9000901316_A.pdf

S08 S08-Haier-QJS15HYRFS-dimension-sheet.pdf

S09 S09-Haier-QJS15HYRFS-manual-Rev1-11-25.pdf

S10 S10-Viking-VGCC530-F20543-EN-installation.pdf

S11 S11-Zephyr-ZSA-E30AS-savonaa-manual.pdf

S12 S12-Haier-Clearance-Review.md

S13 S13-Master-Current-Kitchen-2026-10-26.txt

S14 S14-source-geometry-failed-audit-2026-10-14.md

P01 P01-IMG_5151.png

P02 P02-E9EF3A08-6201-4954-9469-6E6E78FAACC2.jpeg

P03 P03-IMG_5152.jpeg

P04 P04-IMG_5156.jpeg

P05 P05-IMG_5157.jpeg

P06 P06-IMG_5184.jpeg

P07 P07-IMG_5179.jpeg

S15 S15-Latest-owner-instructions-2026-10-29.md

S16 S16-Unit2-structure-reference.json

S17 S17-Owner-panel-coordination-2026-11-01.md

S18 S18-Eaton-BRP20L125G-page-check-2026-11-01.json

S19 S19-D04-interior-coordination-2026-11-01.md

S20 S20-Whole-unit-circuit-reference-2026-11-01.json

S21 S21-Eaton-cover-page-check-2026-11-01.json

S22 S22-D04-review-handoff-2026-11-01.json

S23 S23-Owner-panel-purchase-hold-2026-11-01.json

S24 S24-Independent-electrical-review-2026-11-01.md

Enlaces locales requieren carpeta compartida. Enlaces de fabricante abren web. Hashes/rutas originales: source-register.json.
