Baño de la Unidad 4 — Plan de instalación para John

1231 11th Avenue · Español · Estructura de tina R2 (madera bajo la pestaña) · 14 de octubre de 2026 · Responsable: Claude (Bathroom Producer)

John — la tina y el mármol, paso a paso

Quién hace qué: JOHN · PLOMERO · ELECTRICISTA · TISA · RESPONSABLE. Las líneas sin etiqueta son tuyas. La idea en una frase: la tina descansa en sus propias cuatro patas; la madera va debajo de la pestaña (el borde) de la tina y carga la cubierta y el frente de mármol; nada cuelga de la tina.

Paso 1 — Medir, anotar, mandar (antes de cortar nada)

☐ JOHN Para la tina sobre sus patas en un piso plano. Mide del piso a la cara de arriba de la pestaña en los dos extremos (el catálogo dice 22 pulg; anota lo que midas) y del piso a la cara de abajo de la pestaña (a esa altura va la madera).

☐ JOHN Cubierta de mármol: espesor, largo, ancho. Preséntala en seco sobre la tina y anota cuánto sobresale de la pestaña al frente y en cada extremo.

☐ JOHN Frente de mármol: alto, grueso, largo. Mira su canto de arriba y el canto frontal de la cubierta: ¿inglete a 45° o recto?

☐ JOHN Cuarto: ancho libre entre los montantes desnudos en la pared de la tina.

☐ JOHN Los cantos dañados: raspa un punto. El pegamento viejo se desprende y deja el canto limpio; la piedra rota queda áspera. Foto de los dos.

☐ JOHN La tira extra de mármol recargada a la izquierda en tu foto: ¿qué es? Mídela y manda foto.

> **Manda a Tisa estos números y fotos. Es todo lo que necesitamos de ti antes de construir. No hay nada más que medir.**

Paso 2 — Asentar la tina

☐ JOHN La tina va a lo ancho de la pared del fondo, con el desagüe contra la pared de controles (derecha). Empújala hasta los montantes de esa pared; lo que sobre queda del lado de la ventana y se convierte en la repisa de azulejo.

☐ JOHN Tina sobre sus cuatro patas en el subpiso, calzada a nivel. Película plástica sobre la madera y luego 1–2 pulg de mortero bajo la cuba (Kohler). Pon peso en la cuba hasta que fragüe. La pestaña nunca carga la tina.

☐ PLOMERO (o JOHN) Monta el desagüe/rebosadero K-7271 o K-7272 (Soporte e instalación de la tina). Llena hasta el rebosadero, revisa cada unión, vacía, revisa otra vez. Corrige y repite antes de cerrar nada.

Paso 3 — Madera debajo de la pestaña (esto carga el mármol)

Toda esta madera va DEBAJO de la pestaña. La cara de arriba de cada pieza queda a la altura de la cara de abajo de la pestaña menos 1/8 pulg (mídela con la tina parada en sus patas). Cuando la tina ya esté asentada y probada, rellena ese 1/8 con calzas de madera dura para que la pestaña quede bien respaldada en todo el recorrido de la madera. La cubierta de mármol descansa en la pestaña y la pestaña descansa en la madera. Usa 2×4 de abeto Douglas de plano. Ver los dibujos.

☐ JOHN Pared del fondo: un 2×4 de plano sobre los montantes, a todo lo ancho del cuarto, debajo de la pestaña trasera. Dos tornillos estructurales #10 × 3 pulg en cada montante.

☐ JOHN Pared del lado de controles: lo mismo, de la pared del fondo hasta el bastidor del frente.

☐ JOHN Frente: un murito de 2×4 de plano — placa inferior sobre el subpiso, montantes cada 12 pulg, placa superior — todo de plano para que el conjunto tenga 1 1/2 pulg de grueso, parado debajo de la pestaña delantera. Triplay exterior de 1/2 pulg del lado del cuarto. La cara del triplay queda 1/8 pulg adentro del canto exterior de la pestaña, para que el frente de mármol se pare delante de él, bajo el canto de la cubierta. El bastidor queda debajo de la pestaña y no toca el cuerpo de la tina.

☐ JOHN Lado de la ventana: un 2×4 de plano debajo de la pestaña de ese extremo, de la pared del fondo al bastidor del frente, sobre dos patas cortas de 2×4. De ahí a la pared de la ventana, cierra el sobrante para la repisa de azulejo: un 2×4 en la pared de la ventana y una tapa de triplay de 3/4, a una altura que deje el azulejo terminado apenas arriba del mármol para que escurra hacia él.

☐ JOHN Bloques bajo cada esquina de la cubierta y detrás del triplay donde terminan los extremos del frente.

☐ JOHN Arma y refuerza ahora los dos nichos de la pared del fondo (el grande de unos 12 de ancho × 20–24 de alto con repisa; el chico de unos 8–10 por lado, corrido hacia los controles; ver Nichos). Refuerzos para la barra de apoyo y para el panel de vidrio.

☐ TISA Decidir cómo llegaremos después al desagüe (ver Acceso al desagüe) antes de cerrar la pared de controles.

Paso 4 — Cubierta de mármol

☐ JOHN Limpia la pestaña. Cordón de silicona 100% de 1/8 pulg sobre la pestaña, a 2 pulg o más del canto interior. Baja la cubierta sobre la madera; presiona; pesos toda la noche. Sella la junta interior con silicona y alísala. Nada de adhesivo de construcción ni sellador adhesivo entre piedra y tina: tiene que poder separarse.

Paso 5 — Paredes, impermeabilización, azulejo de pared

☐ JOHN Panel y membrana en las tres paredes de la regadera, los nichos y la repisa de la ventana, todo con pendiente hacia la tina. Fotos antes de cubrir cualquier cosa.

☐ RESPONSABLE El detalle donde la membrana de la pared llega a la cubierta de mármol y a la tina todavía no está aprobado. Lo recibes antes de cerrar esa junta. Sistema: Impermeabilización y refuerzos.

☐ PLOMERO (o JOHN) Delta 144892-CZ-HS: el protector plástico de la válvula queda a ras del azulejo terminado (±3/8 pulg). Bajada al surtidor recta, en cobre o hierro de 1/2, de 8–18 pulg, un codo de 90°, sin PEX. El surtidor debe librar el mármol y caer dentro de la tina. Detalle: Ducha Delta y surtidor de tina.

☐ ELECTRICISTA Contacto, luces del espejo, luz de techo, extractor Panasonic FV-0511VQC1 (GFCI, corte de plafón de 10 1/2 × 10 1/2 pulg, ducto de 6 pulg si se puede). Nada dentro de la pared de la puerta corrediza ni detrás del botiquín. Detalle: Extractor Panasonic.

Paso 6 — Azulejo del piso y después el frente de mármol


☐ TISA Elegir el azulejo del piso y su espesor total (azulejo + mortero + base). Es el único número que no es de John.

☐ JOHN Primero el azulejo del piso. Después el frente de mármol: preséntalo en seco. Su canto de arriba se encuentra con el canto frontal de la cubierta; su pie debe caer sobre el piso terminado con 1/8 pulg de holgura. Si queda largo, recorta el canto de abajo (nadie lo ve). Luego: puntos de silicona en el triplay cada 6 pulg, parar el frente sobre calzas de 1/8 en el azulejo, pegamento para piedra del color del mármol en la junta de arriba, y silicona en la junta del piso cuando todo haya curado. El frente se para en el piso; el pegamento de arriba sella, no sostiene.

Después

Inodoro, lavabo de pedestal y grifería, botiquín y luces (todo eso lo elige TISA), panel de vidrio cuando el azulejo esté terminado, corona y zoclos, pruebas finales. Orden de trabajo: Secuencia de construcción. Materiales: Estado de materiales.

Dibujos y lo poco que hay que revisar

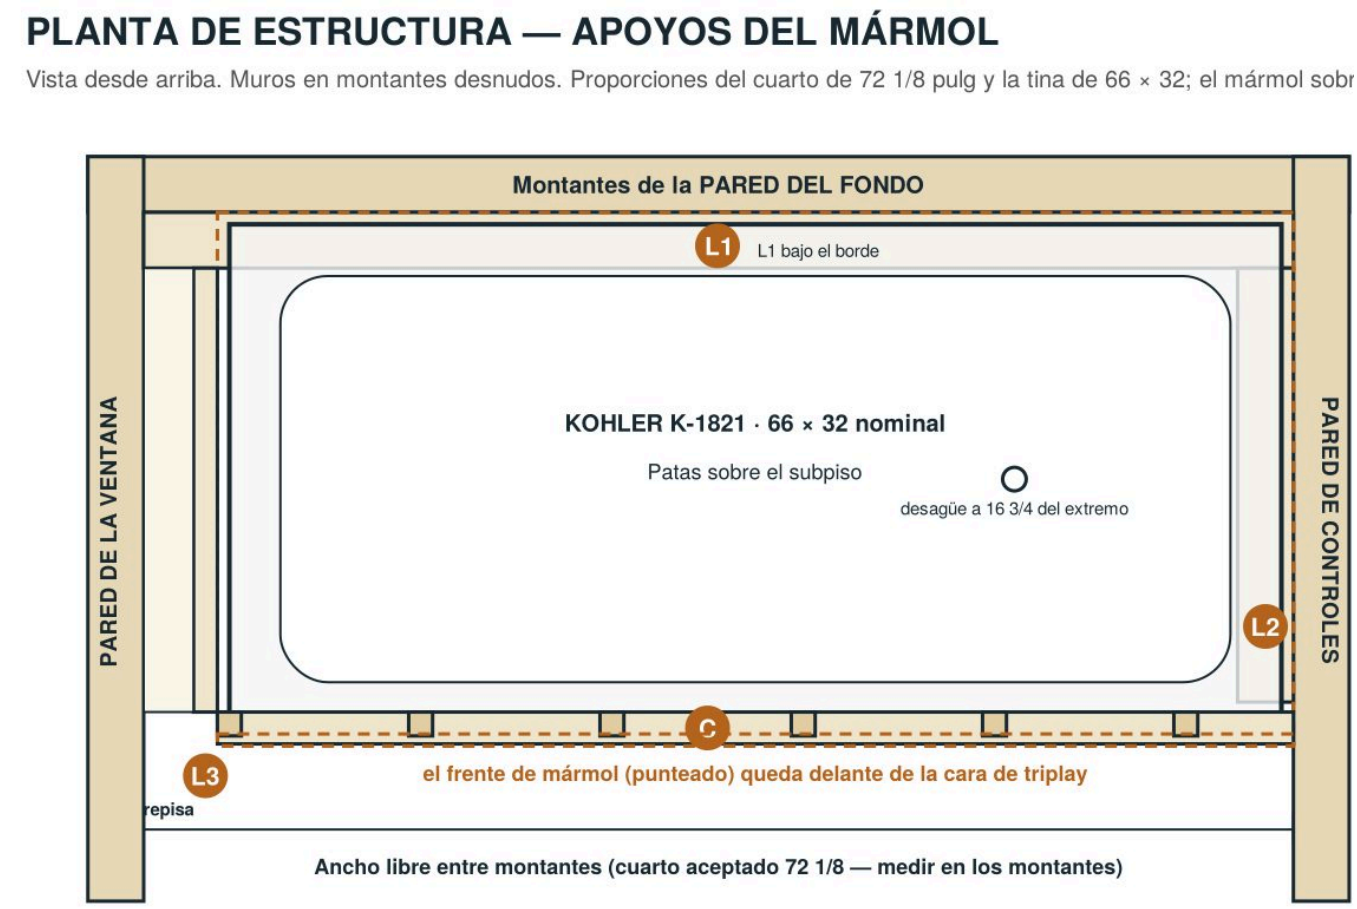


Planta de estructura

- **L1** Pared del fondo: 2×4 de plano sobre los montantes, debajo de la pestaña trasera, a todo lo ancho del cuarto, cara superior = cara de abajo de la pestaña − 1/8. Dos tornillos estructurales #10 × 3 pulg en cada montante.
- **L2** Pared de controles: 2×4 de plano sobre esos montantes, debajo de la pestaña del extremo, de L1 al bastidor del frente, a la misma altura.
- **C** Frente: murito de 2×4 de plano (placas + montantes cada 12 pulg), parado debajo de la pestaña delantera, misma altura, triplay exterior de 1/2 hacia el cuarto. La cara del triplay queda 1/8 adentro del canto exterior de la pestaña; el frente de mármol se para delante.
- **L3** Lado de la ventana: 2×4 de plano debajo de la pestaña de ese extremo, de L1 al bastidor, sobre dos patas cortas 2×4. Misma altura.
- **W** Caja de la repisa de azulejo: llena el sobrante hasta la pared de la ventana. 2×4 en la pared de la ventana + tapa de triplay 3/4, luego panel + azulejo con pendiente hacia la tina, azulejo apenas arriba del mármol.
- **T** La tina va contra la pared de controles; todo el sobrante queda en la repisa de la ventana.

CORTE POR EL FRENTE DE LA TINA (LADO DEL DESAGÜE)

Vista a lo largo de la tina. Sin escala. La madera va debajo de la pestaña; la cubierta descansa en la pesta

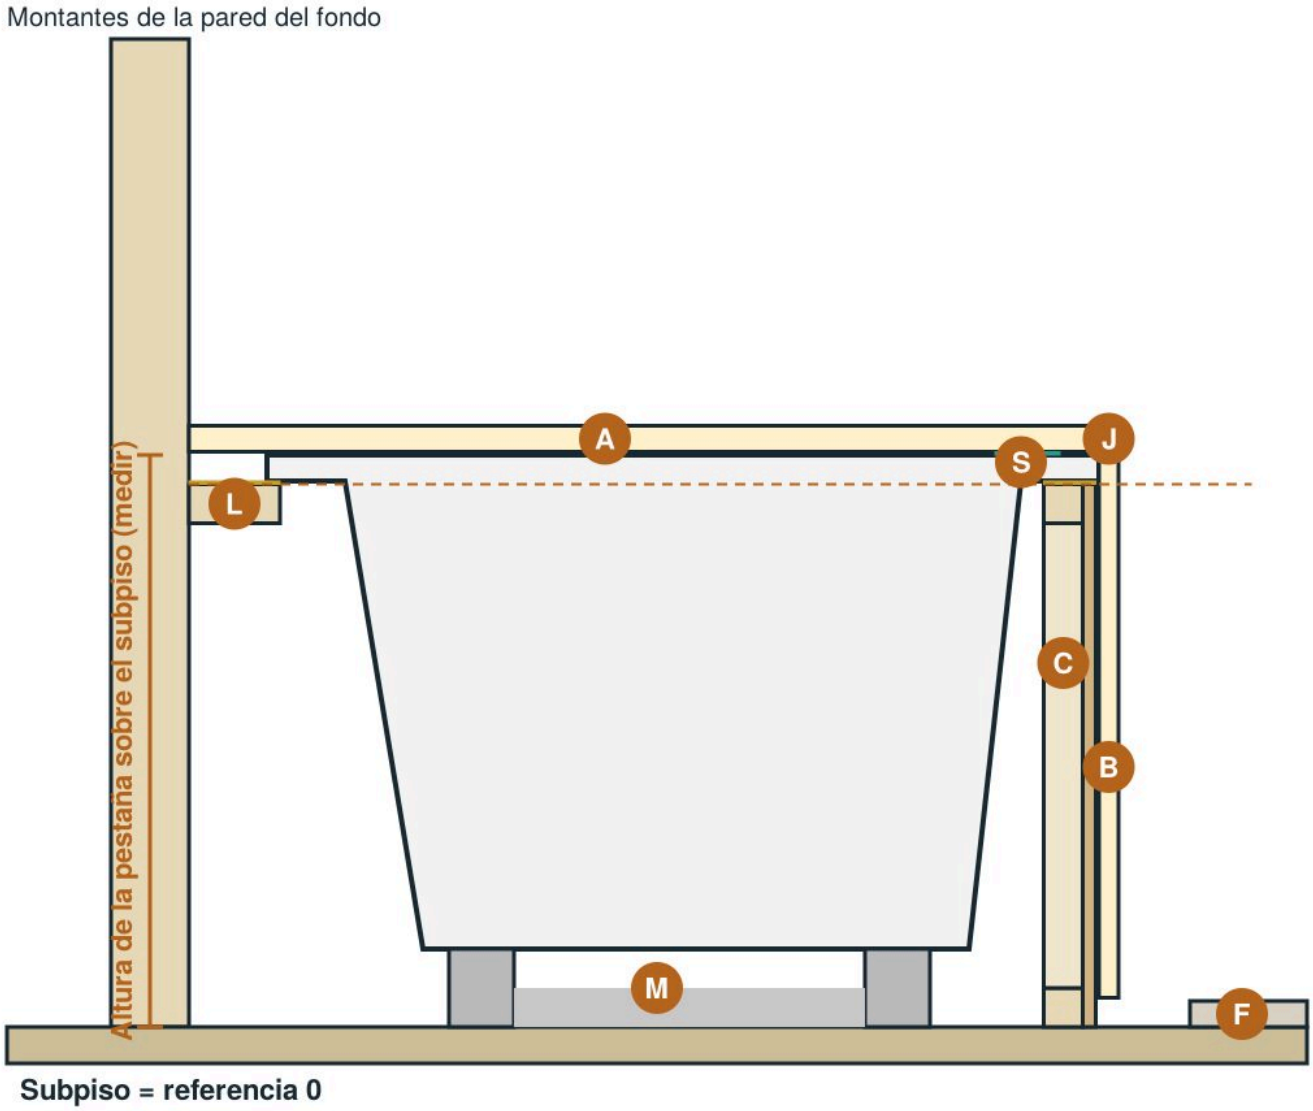

Cargas: tina → sus 4 patas → subpiso. cubierta → pestaña → madera bajo la pestaña. frente → pisc

Si la cubierta sobresale de la pestaña menos de lo que el frente mide de grueso, el frente pegaría con la p

Corte por el frente de la tina

- **A** Cubierta de mármol. Descansa en la pestaña de la tina sobre un cordón de silicona.
- **S** Cordón de silicona 100% de 1/8 pulg sobre el borde, a 2 pulg o más del borde interior (Kohler K-550). Solo sella; queda separable.
- **J** Junta superior del frente: inglete a 45° o recta — revisar las piezas. La cubierta suele sobresalir de la pestaña más o menos lo que el frente mide de grueso.
- **B** Frente de mármol. Apoya en el piso terminado sobre silicona de 1/8; puntos de silicona lo sujetan al triplay.

- C Bastidor del frente debajo de la pestaña: 2×4 de plano, montantes a 12 pulg, triplay exterior de 1/2 hacia el cuarto. Cara superior de la madera = cara de abajo de la pestaña − 1/8, calzado después de asentar la tina.
- L Pieza del fondo debajo de la pestaña: 2×4 de plano sobre los montantes, cara superior = cara de abajo de la pestaña − 1/8, dos tornillos #10 × 3 por montante.
- M Tina sobre sus 4 patas de fábrica en el subpiso, calzada a nivel; mortero de 1–2 pulg bajo la cuba (Kohler). Nunca sobre el borde.
- F Piso terminado (azulejo + mortero + base): lo elige Tisa. El frente se coloca después del azulejo del piso.

Si el frente queda corto o largo

☐ Cara superior de la cubierta = altura de la pestaña + 1/8 de silicona + espesor de la cubierta. Pie del frente = eso, menos el alto del frente (y menos otra vez el espesor de la cubierta si la junta es recta y no a inglete). Debe caer más o menos 1/8 pulg arriba del piso terminado.

☐ Frente largo → recortar su canto de abajo. Frente corto por más de 1/8 → calzar las cuatro patas de la tina esa diferencia ANTES de asentarla con mortero. Nunca subir la tina para arreglar un frente largo.

☐ Si la cubierta sobresale de la pestaña MENOS de lo que el frente mide de grueso, el frente pegaría con la pestaña. Parar y avisar al responsable antes de cortar.

Acceso al desagüe

Kohler pide acceso al desagüe y a las conexiones. El frente de mármol es una sola pieza, así que el acceso tiene que venir por la pared del lado de controles (una abertura desde el cuarto que esté detrás) o por abajo. TISA decide cuál. Si ninguna sirve, todas las uniones del desagüe van soldadas con cemento (sin uniones deslizantes) y el frente se pega solo con silicona para poder soltarlo después. No cerrar la pared de controles hasta que esto esté decidido.

Los cantos dañados

☐ Pegamento viejo: espátula de plástico y removedor seguro para piedra. No desbastar el largo del canto. Astillas: epóxico para piedra del color del mármol (AKEPOX 5010 es el candidato; lo compra el RESPONSABLE después de una prueba en un punto oculto). La meta es una junta limpia y discreta, no invisible.

☐ Piedra con tina: solo silicona 100%. Piedra con piedra (cubierta con frente): pegamento para piedra del color del mármol, sobre un frente que ya está parado en el piso.

Materiales para la madera

☐ 2×4 de abeto Douglas: pieza del fondo tan larga como el ancho del cuarto; pieza del extremo y pieza del lado de la ventana de más o menos el ancho de la tina menos 5 pulg; dos placas del frente tan largas como la tina; montantes, uno por cada 12 pulg más uno, cada uno de (altura bajo la pestaña − 1/8 − 3); dos patas cortas; bloques. Una hoja de triplay exterior de 1/2 para el frente. Recorte de triplay de 3/4 para la tapa de la repisa. Tornillos estructurales #10 × 3 pulg (1 lb), tornillos de 1 5/8, calzas, un saco de 60 lb de mortero, película plástica, 2 tubos de silicona 100%. Pegamento para piedra: responsable.



Foto de John, 14 de octubre: cubierta y frente de mármol



Foto de John, 14 de octubre: la tina

Especificaciones e instalación del baño


Instalar la tina Kohler y su cubierta y frente originales de mármol. Esta referencia cubre conjunto, plomería, impermeabilización, aparatos y acabados.



Referencia de diseño proporcionada por Tisa. Define el aspecto y la distribución; los ejemplos de productos y las medidas impresas en la imagen aún requieren verificación.

Desde la entrada: lavabo a la izquierda, inodoro a la derecha y tina al fondo. Mármol sobre el borde y el frente; azulejo marfil cálido y Champagne Bronze. Conservar una barra horizontal. Botiquín e iluminación por elegir.

Distribución del baño

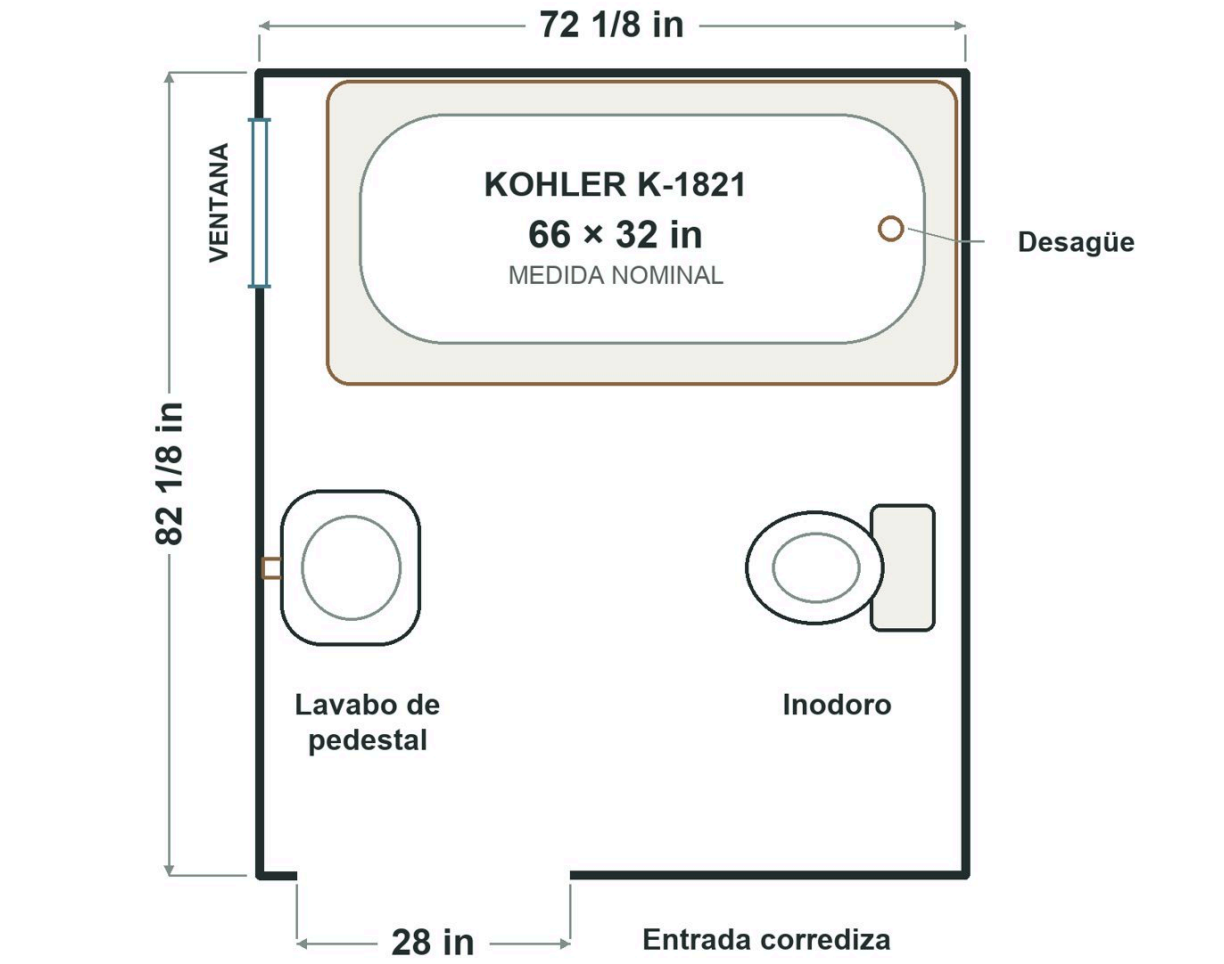

Medidas de cuarto y puerta aceptadas por Tisa, con su distribución de aparatos. Posiciones indicativas; no usar para cortes de piedra ni centros de instalaciones.

Usar cotas bloqueadas 72⅛ × 82⅛ y entrada de 28 pulgadas. Las caras opuestas difieren 1/16; mantener las cotas aceptadas. Quedan sustituidas las medidas anteriores 77 3/16 × 83⅛ y 81 × 74.

La instalación de tina no cambia: se conservan tina y ambas piezas de mármol. También se mantiene la puerta corrediza; el símbolo abatible de la captura no la sustituye.

Opciones de espejo e iluminación



Dos alternativas proporcionadas por Tisa. Ninguna de las dos configuraciones está registrada como selección final.

Opción 1: botiquín empotrado con espejo arqueado y dos apliques laterales. Opción 2: botiquín rectangular con una luminaria de tres luces encima.

La imagen general también muestra ejemplos Pottery Barn Vintage Inset y Kohler Verdera. Confirmar el producto, el hueco del muro y el eje del lavabo antes de elegir. La versión con luz integrada es otra alternativa.

Nichos y detalles de acabados

Dos nichos en la pared del fondo; enmarcar y reforzar antes de cerrar. Las medidas son objetivos aproximados. Coordinar huecos, estructura y alturas con azulejo; confirmar si se refieren a abertura terminada o a estructura antes de cortar.

Nicho grande para botellas

CANTIDAD 1 · 12 pulg de ancho × 20–24 de alto · Repisa divisoria

Para champú, acondicionador, jabón corporal y botellas. Registrar altura de repisa, alturas libres para botellas, fondo terminado y cotas inferior/superior desde el piso terminado. Coordinar estructura y refuerzos con el azulejo.

Nicho pequeño para jabón

CANTIDAD 1 · Aproximadamente 8–10 pulg por lado · Hacia los controles

Para jabón en barra y artículos pequeños. Registrar ancho, alto, fondo y altura terminados. Ambos van empotrados en la pared del fondo, para evitar canastas colgantes. Impermeabilizar ambos e inclinar ligeramente todas las superficies horizontales hacia la tina.

Repisa de ventana y acabados

Repisa junto a ventana: azulejo marfil cálido independiente, impermeabilizado y con pendiente a la tina. No cubrirla con el mármol tipo cascada. Medir ancho/fondo terminados y uniones; la diferencia aritmética de 6⅛ pulg no es medida de corte.

Paredes: cerámica marfil cálido. Piso: porcelanato mate con aspecto de caliza cálida. Elegir tamaño, boquilla, perfiles y distribución; calcular cantidades con superficies medidas.

Molduras y accesorios

Corona tradicional alrededor del techo, también sobre ventana donde quepa. Ajustar perfil a esa holgura; zócalos en paredes secas. Una barra horizontal con refuerzo, accesorios para toallas y portarrollos; largos y posiciones dependen de productos elegidos.

Paneles decorativos aún por decidir. Preparar diseño y precio; no comprar ni instalar sin aprobación de Tisa. Registrar medidas y posición de nichos en el tablero existente.

Replanteo de lavabo y botiquín

DISPONIBLE · Un lavabo de pedestal · Grifería Champagne Bronze por elegir

Instalar el pedestal conservado en la pared izquierda. Centrar botiquín e iluminación sobre el lavabo; la pieza real, pedestal y patrón de fijaciones definen su instalación.

Lavabo y grifería

- La cubeta y el pedestal conservados determinan ancho, proyección y altura instalada; sus fijaciones originales definen los anclajes.
- Colocar contra la pared terminada, dejando espacio para trampa P, conexiones y llaves accesibles. Coordinar su eje con espejo e iluminación.
- Ajustar la grifería Champagne Bronze al número y separación de perforaciones existentes, con alcance adecuado hacia la cubeta. Usar su hueco de desagüe y patrón de fijación.

Pared y hueco del botiquín

- Elegir un botiquín que quepa en el ancho de pared sobre lavabo y la altura disponible hasta el techo; dejar giro de puerta y espacio para apliques laterales o luz superior.
- El hueco debe caber entre estructura y librar tuberías, cables y ventilación. Comprobar fondo útil antes de comprar; no cortar elementos estructurales para copiar la imagen.

Confirmar botiquín e iluminación

El espejo arqueado empotrado sigue como opción. Tamaño total, hueco, profundidad y holgura de bisagras dependen del modelo elegido. Las imágenes son referencias de selección.

Opciones: dos apliques a los lados del espejo o una luminaria de tres luces arriba. Los tableros también muestran modelos rectangulares y con luz integrada. Coordinar cajas con dimensiones de luminarias y eje del botiquín.

Elegir grifería Champagne Bronze compatible con el pedestal disponible. Confirmar alcance, perforaciones, desagüe, trampa P, conexiones, llaves y fijaciones antes de comprar.

Detalle de selección: los registros no identifican modelo actual de pedestal ni botiquín elegido. Sus fijaciones/conexiones reales y el hueco del botiquín elegido gobiernan la instalación; las imágenes antiguas no dan ejes de plomería.

Encuentros y comprobaciones

Alcance: conservar tina, cubierta y frente originales; construir apoyo independiente para piedra, impermeabilización continua, plomería coordinada y acceso de servicio.

Coordinación de instalaciones

- La tina transmite su peso por patas/base originales al piso resistente. Cubierta y frente tienen apoyo y retención propios. Presentar las piezas originales para establecer la geometría; la altura final incluye cubierta y junta sobre el borde de tina.
- Conectar desagüe de rebosadero ranurado K-7271/K-7272 y válvula/surtidor Delta al conjunto terminado. Electricidad incluye extractor, luces y contacto. Continuar impermeabilización por nichos, ventana y unión piedra/tina. Medir vidrio tras acabados.

Comprobaciones de obra

- Usar cubierta y frente originales como plantillas de ajuste para sus apoyos. Conservar cargas separadas, mármol sobre el borde y acceso al desagüe. La elevación de apoyos sale del conjunto presentado, no solo de 22 pulgadas.
- Antes de cerrar pared/frente: instalaciones aceptadas, refuerzos fotografiados, uniones de agua probadas y conexión impermeable muro–piedra–tina resuelta e inspeccionada.
- Antes del vidrio: piedra/azulejo fijos y curados; medidas finales y soporte de anclajes verificados. Antes de entregar: completar pruebas funcionales y reparar fugas o defectos.

Registro de trabajos ocultos

Conservar fotos de apoyos ocultos, conexiones de desagüe/rebosadero y Delta, refuerzos e impermeabilización continua antes de cerrar. Sirven para mantenimiento e inspección; no se exige entregar una hoja de medidas para iniciar.

Materiales que deben prepararse

Conservar juntos tina, cubierta y frente disponibles. Revisar desagüe/rebosadero, válvula/surtidor Delta, producto de asiento, apoyos/fijaciones de piedra, silicón desmontable, sistema impermeable elegido, azulejo/mortero/boquilla y juntas flexibles. Cantidades de estructura, azulejo y reparaciones salen del conjunto medido; usar lista de compras tras revisar existencias.

El responsable del proyecto gestiona programación, decisiones de materiales, información pendiente y tablero existente. Resolver conflictos en el detalle afectado; la secuencia siguiente es el plan de ejecución.

Tina y mármol originales



Fotos de John del 14 de octubre: tina disponible, cubierta original y panel frontal separados. Ambas piezas de mármol forman parte del conjunto de instalación.


Kohler Underscore K-1821: acrílico, 66 × 32 × 22 pulg nominales. Centro de desagüe: 16¾ pulg desde el extremo exterior del lado de desagüe y 16 pulg en el ancho de 32. Salida: 1½ pulg. Rebosadero ranurado: K-7271 o K-7272.

Conjunto original

- Cubierta y frente originales disponibles. Retirar adhesivo viejo y presentar el encuentro original. Reparar astillas y rectificar solo cantos dañados, conservando dimensiones; no desbastar largos completos ni cortar nuevos ingletes de 45° automáticamente.
- Tina a lo ancho de la pared del fondo, desagüe hacia controles. Cubierta original sobre el borde y frente original expuesto. Repisa independiente junto a ventana: azulejo marfil, impermeabilizado y con pendiente hacia tina.
- La altura final depende del apoyo de tina, sus 22 pulg nominales, espesor de cubierta y junta real. Relacionar borde inferior del frente con piso terminado; conservar acceso al desagüe detrás o debajo del frente.

Detalle local: no hay cotas de espesor, perfil ni altura del frente en los registros; ajustar las piezas conservadas. Apoyo/retención y unión impermeable especial siguen como detalles del proyecto. Se busca junta discreta, sin garantizar invisibilidad.

Soporte e instalación de la tina

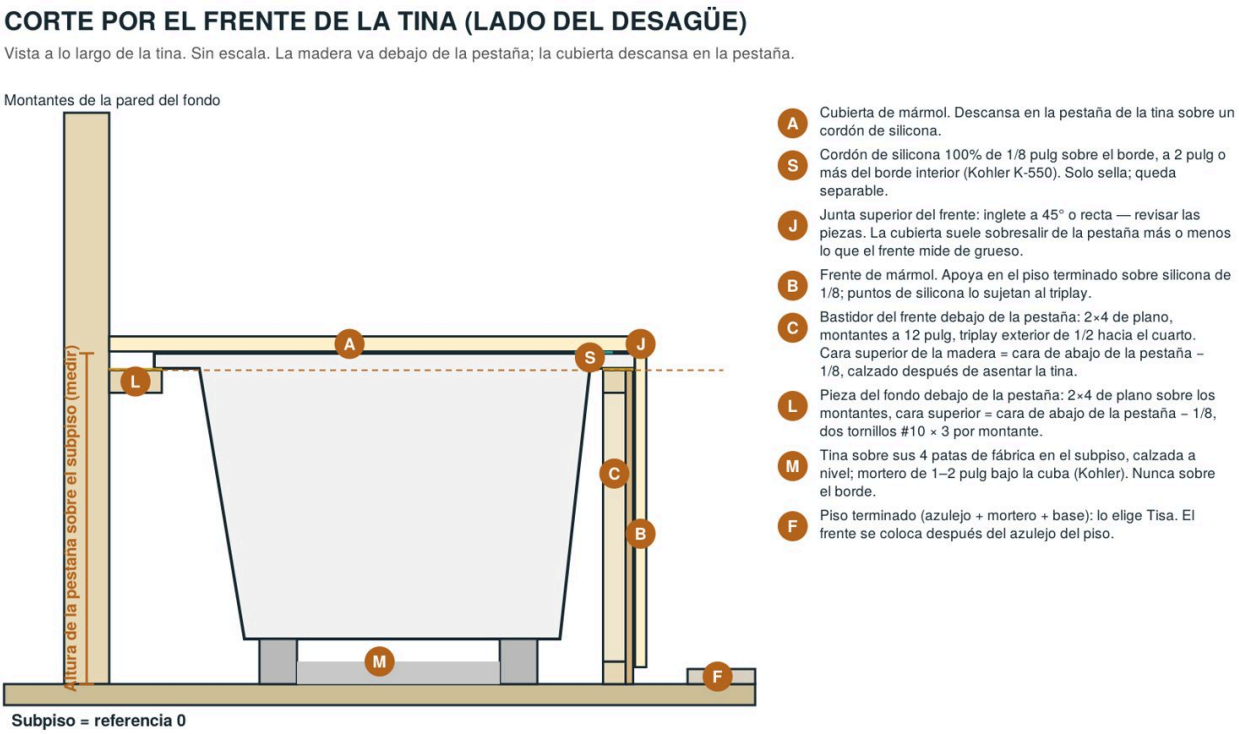

Cargas: tina → sus 4 patas → subpiso. cubierta → pestaña → madera bajo la pestaña. frente → piso terminado + triplay.

Si la cubierta sobresale de la pestaña menos de lo que el frente mide de grueso, el frente pegaría con la pestaña: parar y avisar antes de cortar.

Replantear y apoyar

- Usar piso nivelado y con soporte adecuado. Tina más agua llena suman unas 802 lb, sin persona, mármol ni estructura; el piso soporta el conjunto completo.
- Dar a cubierta y frente apoyo y retención independientes, conservando acceso al desagüe. K-550 es la base de plantilla/guía bajo cubierta; el hueco drop-in de 64½ × 30½ pulg no es plantilla de corte de piedra.
- Montar K-7271/K-7272 y alinear desagüe. Kohler permite cama de mortero de 1–2 pulg o adhesivo compatible en patas/base. El borde no soporta el peso de la tina.
- Nivelar sobre patas/base originales y respetar carga/curado. Los separadores de ⅛ pulg ilustran montaje drop-in; no fijan la altura del apoyo para este mármol sobre borde.

Probar y después colocar la piedra

- Conectar con uniones visibles. Llenar hasta rebosadero, comprobarlo y revisar cada conexión; vaciar y revisar de nuevo. Reparar fugas y repetir antes de cerrar el frente.
- Ajustar el hueco existente con detalle de borde/plantilla K-550. Usar junta desmontable de silicón, no sellador adhesivo que pegue piedra y tina permanentemente. Cordón a por lo menos 2 pulg del

borde interior.

- Completar unión impermeable muro–piedra–tina y junta de piedra; fijar frente sobre su apoyo/retención, conservando acceso. Proteger tina durante acabados.

Base técnica: ficha Kohler K-1821; guía 1084212-2-H; guía bajo cubierta 114753-2-CD. La antigua 1023730-2-F enviada por John queda como referencia, no como detalle específico de montaje.

Plomería, electricidad y ventilación

Ducha Delta y surtidor de tina

- Usar conjunto comprado 144892-CZ-HS. Confirmar sufijo de válvula R10000 y adaptador. Hacer muestra de panel, impermeabilización, mortero y azulejo; fijar profundidad de válvula respecto a la cara terminada. Protector a ras del azulejo, con tolerancia de ±⅜ de pulgada; con llaves integradas, a ras o hasta ⅜ de pulgada detrás.
- Flecha UP hacia arriba; salida superior a ducha e inferior a tina. Bajada al surtidor: cobre/hierro de ½ pulgada, recta de 8–18 pulgadas y un codo de 90° de cobre/hierro. No usar PEX en esa bajada ni sustituir por surtidor sobre cubierta.
- Presentar surtidor, mármol y plano de azulejo antes de fijar alturas. El chorro debe pasar la piedra y caer dentro de la tina. Verificar controles, manguera y vidrio. Usar la medida de salida indicada para el surtidor real.
- Purgar según Delta, armar y probar fugas antes de cerrar. Al terminar, comprobar que sale frío primero y ajustar el límite con termómetro a un máximo de 120°F, o el límite local inferior aplicable.

Lavabo, inodoro y electricidad

Usar desagüe de rebosadero ranurado compatible, adaptadores y cambios necesarios a plomería existente. Ajustar grifería, desagüe, trampa P, conexiones, llaves y fijaciones al pedestal. Hace falta inodoro nuevo; modelo por elegir según salida y holguras existentes. Confirmar conexión/adaptador y dejar llaves accesibles.

Electricista: registrar circuito y ubicación de contacto, luces de espejo/techo y extractor/control. Coordinar protección GFCI, luminarias para zona húmeda e inspección con el plan eléctrico. No colocar cables/cajas en el bolsillo de la puerta ni en el hueco del botiquín.

Extractor Panasonic

FV-0511VQC1: 120 V, 60 Hz y tierra; sin luz integrada. Salida exclusiva al exterior, con recorrido corto y diámetro preferente de 6 pulgadas; el fabricante también permite 4 pulgadas de diámetro. Fijar/sellar juntas, aislar conducto en ático, quitar cinta de transporte de compuerta y colocar salida antirretorno. No usar regulador electrónico de velocidad ni atenuador; sensores requieren alimentación.

Verificar vigas y hueco cuadrado de plafón de 10½ × 10½ pulgadas antes de cortar. Sobre tina requiere alimentación protegida GFCI. Iniciar en 80 CFM / 20 minutos / aproximadamente 50% HR; medir flujo y ajustar. Probar sensores y entrada de aire con puerta cerrada.

Guías: Delta 107528 Rev I; Panasonic FV-0511VQC1 inglés y español.

Impermeabilización y refuerzos

Un sistema coordinado para la zona húmeda

Sistema propuesto: Schluter KERDI-BOARD, KERDI-BAND, esquinas/sellos compatibles, KERDI-FIX y ALL-SET. Revisar existencias. Registrar el sistema completo seleccionado antes de comprar o mezclar materiales.

- Preparar estructura firme. Panel propuesto: ½ pulgada con montantes hasta 16 pulgadas entre ejes; ¾ a 24 pulgadas. Usar tornillos/arandelas del sistema, separación máxima de 12 pulgadas en pared y penetración mínima de ¾ de pulgada en madera o ⅜ en metal. Añadir refuerzos de nichos, barra, vidrio y aparatos antes de cubrir.
- Sellar juntas, esquinas, fijaciones y perforaciones; mantener traslapes de 2 pulgadas y llevar impermeabilización al menos a la altura de la regadera. Formar ambos nichos y repisa independiente de ventana con pendiente hacia la tina.
- Detalle local pendiente — responsable del proyecto: terminación membrana de pared → cubierta → tina. No es el detalle estándar Schluter de tina con pestaña. La unión compatible exacta aún no está especificada; resolverla antes de cerrar este encuentro. El silicón visible es solo junta de acabado.

Azulejo piedra y vidrio transparente

- Registrar productos de pared/piso, tamaño, junta/boquilla, perfiles y mortero compatible. Dibujar distribución con ventana, nichos y borde de mármol. Acordar cortes equilibrados y juntas visibles antes de colocar. Levantar piezas de muestra: mínimo 95% de contacto de mortero en zona húmeda. En esquinas y cambios de material usar junta flexible/perfil compatible, no boquilla rígida.
- Verificar subpiso real, rigidez, base y altura terminada antes de poner azulejo de piso. Elegir el conjunto completo de soporte; el panel de pared no define el piso. Medir superficie expuesta y rendimiento por caja.
- Revisar y fotografiar la impermeabilización antes de cubrir. Instalar piedra y azulejo contiguo en el orden del corte aceptado de muro–piedra–tina. Revisar la conexión impermeable oculta antes de cerrar. No retirar una cubierta ya sellada para colocar azulejo. Instalar piso y respetar curado.

Vidrio y entrega

Con azulejo y mármol fijos y curados, el vidriero mide el panel parcial de vidrio transparente junto a controles y especifica vidrio de seguridad, espesor, herrajes y anclajes. Revisar surtidor, ducha de mano, limpieza y entrada. No improvisar perforaciones en piedra, tina o impermeabilización horizontal.

Instalar botiquín/luces elegidos, inodoro, pedestal, accesorios, corona y zoclos. Revisar ventana, puerta, agua/desagües, extractor, iluminación y temperatura. Guardar pruebas, fotos ocultas y finales; cerrar cada pendiente.

Referencia: manual Schluter Shower System, secciones de tinas, nichos y KERDI-BOARD. Productos y unión especial piedra/tina deben corresponder al conjunto real.

Estado de materiales y compras

Revisar existencias antes de comprar. Medidas/cantidades desconocidas se levantan en obra; el inventario define faltantes.

Tina

DISPONIBLE · 1 unidad

Modelo de referencia Kohler K-1821; 66 × 32 × 22 pulg nominales. Verificar etiqueta real, patas/base y centros de desagüe. Reutilizar y proteger.

Cubierta y frente originales de mármol

DISPONIBLES · 1 cubierta + 1 frente

Reutilizar ambas piezas como plantillas de ajuste. Hueco, perfil, espesor y estado originales gobiernan apoyos, ajuste y reparaciones; no se especifica piedra de reemplazo.

Lavabo de pedestal y hoja de puerta

DISPONIBLES · 1 lavabo + 1 hoja conservada

Medir lavabo y perforaciones. Reutilizar hoja: Ervin reporta 27¼ × 79⅜ pulg. Espesor y herrajes corresponden al paquete de puerta corrediza; ese trabajo no está asignado a John.

Conjunto de ducha Delta Arcadia

COMPRADO · 1 conjunto · Recepción sin confirmar

144892-CZ-HS, Champagne Bronze, válvula incluida. Lowe's $291.54 con impuestos; enviado el 13 de octubre, ETA original 19 de octubre. Inventariar componentes incluidos y listar solo faltantes.

Extractor Panasonic

ENTREGADO · 1 unidad · Instalación sin verificar

WhisperSense FV-0511VQC1. Home Depot $243.31 con impuestos; entregado el 15 de septiembre. Verificar unidad, conducto/salida, control, alimentación y funcionamiento.

Inodoro nuevo — modelo por elegir

POR COMPRAR · 1 inodoro nuevo

Medir salida existente y holguras reales para elegir. Confirmar modelo, conexión/adaptador y asiento antes de comprar o trabajar la brida.

Materiales para obra e instalaciones

Revisar existencias antes de comprar. Medidas/cantidades desconocidas se levantan en obra; el inventario define faltantes.

Desagüe y rebosadero de tina

COMPRAR TRAS INVENTARIO · 1 conjunto compatible

Desagüe K-7271 o K-7272 de rebosadero ranurado para K-1821. Reutilizar piezas compatibles y agregar solo faltantes/adaptadores necesarios para la conexión real.

Grifería y desagüe del lavabo

COMPRAR TRAS INVENTARIO · 1 grifería + 1 desagüe + 1 trampa P

Grifería Champagne Bronze según perforaciones y alcance medidos. Revisar piezas de desagüe conservadas y tamaños antes de pedir.

Conexiones llaves y fijación del lavabo

COMPRAR TRAS INVENTARIO · Cantidades por confirmar

Listar por separado conexiones caliente/fría, llaves, adaptadores y fijaciones según lavabo real e instalaciones existentes.

Materiales de apoyo de tina y piedra

COMPRAR TRAS INVENTARIO · Cómputo medido pendiente

Asiento: mortero o adhesivo permitido en patas/base; apoyos de piedra y retención del frente independientes. Candidato para junta piedra/piedra, no comprado: AKEPOX 5010 Coloured. Limpiar/rugosizar ligeramente caras de unión; probar color/manchado en zona oculta de la piedra real. Mezcla 2:1; a 20°C: trabajo 20–30 min, mover tras 6–8 h, mecanizar tras 12–16 h y estabilidad máxima a 7 días. Restaurar acabado local tras curado. No sustituye apoyos ni silicón separable entre mármol y acrílico.

Impermeabilización y estructura de nichos

PROPUESTA · Existencias y cantidades sin verificar

Propuesta KERDI-BOARD/BAND, esquinas/sellos, KERDI-FIX y ALL-SET. Registrar sistema elegido, espesor, superficie/traslapes, fijaciones, estructura/refuerzos de nichos y selladores.

Materiales de puerta y ventilación

COMPRAR TRAS INVENTARIO · Cantidades por confirmar

Bastidor/cierre y jambas/molduras faltantes según paquete de puerta. Conducto/salida: medir recorrido y diámetro; inventariar accesorios, sellado/aislamiento y controles.

Materiales para acabados

Revisar existencias antes de comprar. Medidas/cantidades desconocidas se levantan en obra; el inventario define faltantes.

Paredes de ducha y repisa de ventana

COMPRAR TRAS INVENTARIO

Cerámica marfil cálido. Registrar producto, tamaño, distribución, superficie neta, cortes, desperdicio, rendimiento y cajas. Incluir ambos nichos y repisa independiente inclinada.

Piso del baño

COMPRAR TRAS INVENTARIO

Porcelanato mate tipo caliza cálida. Registrar superficie expuesta, tamaño, base, altura terminada, umbral, desperdicio y cajas.

Materiales de colocación y perfiles

COMPRAR TRAS INVENTARIO

Mortero compatible, boquilla/color, sellador flexible, perfiles y transiciones. Registrar juntas, largos y cantidades según rendimiento del producto.

Mampara parcial transparente

POR COMPRAR · 1 panel tras medir acabados

Junto a controles; registrar ancho/alto finales, espesor de vidrio de seguridad, acabado de herrajes, anclajes y holguras. Vidriero aporta plantilla y fijaciones.

Botiquín e iluminación

COMPRAR TRAS INVENTARIO · Selección pendiente

Un botiquín empotrado, tamaño tras medir pared/lavabo. Elegir dos apliques laterales o una luminaria de tres luces arriba; confirmar luz de techo, controles, tamaños y cantidades.

Corona zócalos y accesorios

COMPRAR TRAS INVENTARIO

Medir perfiles y largos, incluida corona sobre ventana si cabe. Una barra horizontal: elegir largo/posición. Registrar toalleros/aro, portarrollos y fijaciones.

Paneles decorativos

EN ESPERA · No comprar ni instalar

Se requiere aprobación de Tisa tras diseño detallado y precio. No tratarlos como acabado aprobado.

Secuencia de construcción

Seguir estas diez etapas. El responsable del proyecto gestiona programación, decisiones de materiales e información pendiente en el sistema de tareas existente.

- Confirmar medidas de tina, estructura, ubicación de desagües e instalaciones. Incluir cubierta/frente disponibles, corte de apoyos medido y alcance del surtidor.
- Enmarcar y reforzar ambos nichos antes de cerrar paredes. Coordinar objetivos aproximados de 12 × 20–24 y 8–10 pulg con huecos terminados y juntas.
- Completar instalaciones de plomería y electricidad, incluida preparación de botiquín empotrado e iluminación. Verificar viabilidad, piezas Delta incluidas y fotos de trabajos ocultos.
- Instalar, asegurar y probar la tina sobre patas/base. Revisar uniones visibles de desagüe/rebosadero al llenar y vaciar; reparar y repetir antes de cerrar.
- Completar impermeabilización y preparar paredes y piso. Inspeccionar el sistema elegido y resolver la unión muro–piedra–tina antes de ocultarla.
- Coordinar e instalar azulejo de ducha, cubierta/frente originales tipo cascada y repisa independiente de azulejo. Seguir el corte aceptado y conservar pendientes de repisa/nichos.
- Instalar azulejo de piso sobre el conjunto verificado. Respetar el curado exigido por los productos elegidos.
- Instalar inodoro, pedestal, griferías, iluminación y accesorios después de sus acabados correspondientes. Revisar fijaciones, conexiones y funcionamiento.
- Tomar medidas finales e instalar mampara parcial transparente junto a controles. Verificar anclajes, holguras de surtidor/regadera de mano, acceso y limpieza.
- Completar molduras, sellado y acabados. Probar agua/desagües, controles/temperatura, extractor, luces y puerta; registrar fotos finales y corregir defectos.

Fotos de obra y medidas



Fotos enviadas por Ervin el 14 de octubre: entrada del baño, estructura expuesta y pared contigua desde dos puntos del pasillo. Documentan el estado de obra, no trabajos terminados ni medidas.

Contexto de instalación

- Habitación: medidas aceptadas 72⅛ × 82⅛ pulgadas y entrada de 28, según captura confirmada por Tisa el 14 de octubre. Coinciden con las cotas interiores de John. La corrección separada de Magicplan no cambia la instalación de la tina.
- El conjunto usa las cotas K-1821 y ajuste de piedra original de este plan. Seleccionar inodoro según salida y holguras existentes; fabricar vidrio tras terminar azulejo y piedra.
- Huella, fijaciones y perforaciones reales del lavabo conservado gobiernan su instalación. Botiquín y luces deben caber arriba, sin interferir con estructura, plomería, cables o ventilación.
- Puerta corrediza: abertura al extremo izquierdo; hoja desliza a la derecha desde el pasillo. Reutilizar hoja. Medidas y herrajes se coordinan en su paquete; trabajo no asignado a John.

Fuentes: paquete de producción del baño y detalle de azulejos. Compras contrastadas con pedido/envío de Lowe’s y entrega de Home Depot; referencias de diseño proporcionadas por Tisa.

El responsable del proyecto mantiene decisiones de diseño, compras y prioridades en el sistema existente. Las fotos documentan condiciones e instalación oculta; no sustituyen cotas.
